


# 富岡町における 除染の進捗状況について

令和元年6月21日 環境省 福島地方環境事務所



**避難指示解除済区域における除染について**

- **フォローアップ除染**

- 町民からのお問い合わせ案件 対応完了495件／525件
- 事後モニタリング結果からの抽出案件 対応完了552件／600件
  - ※対応完了：施工完了もしくは現地調査の結果施工不要となった案件

- **事後モニタリング**

- 実施対象：避難指示解除済エリア
- 進捗：完了

- **解体工事進捗状況**

- 平成30年度まで：2,504件解体完了
- 平成31年度：320件解体予定（工期：平成31年4月10日から12月27日まで）
  - 三者立会済み153件、解体作業中8件

**特定復興再生拠点区域における除染について**

## ○除染関係

- ・夜の森先行地区：30年度後半の解体着手画地、未同意画地等を除き完了
- ・A地区：同意取得率…84.9%（6/3時点）  
公道、夜の森つつみ公園、新田団地等について除染実施中。  
農地の除染作業を開始。
- ・BC地区：解体撤去等及び除染等工事を公告中

## ○解体関係

- ・夜の森先行地区：解体申請数212件、解体完了160件
- ・A地区：解体申請数272件、解体作業中30件、解体完了63件
- ・BC地区：解体申請数54件




## ○ 帰還困難区域内の夜の森桜並木の除染実施時期



## <追加除染前>



桜の木の根元周辺は堆積物除去のみ実施  
(根の損傷を避けるため)

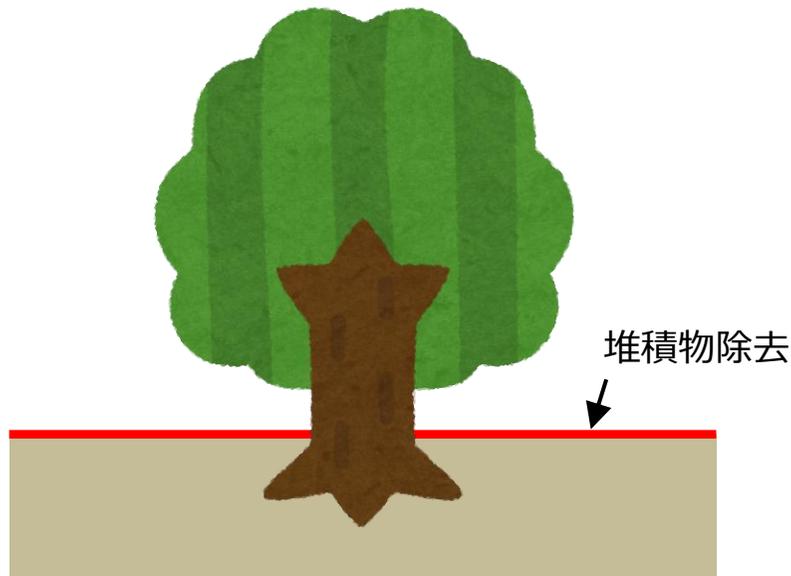

根元周辺に高線量の土が残され、  
付近の空間線量に影響

## <追加除染方法>

根の張りを確認したうえで、桜の根元から離れた場所については表土剥取（5 cm）及び覆土を実施。  
根元のすぐ側には2 cm程度の覆土を実施。

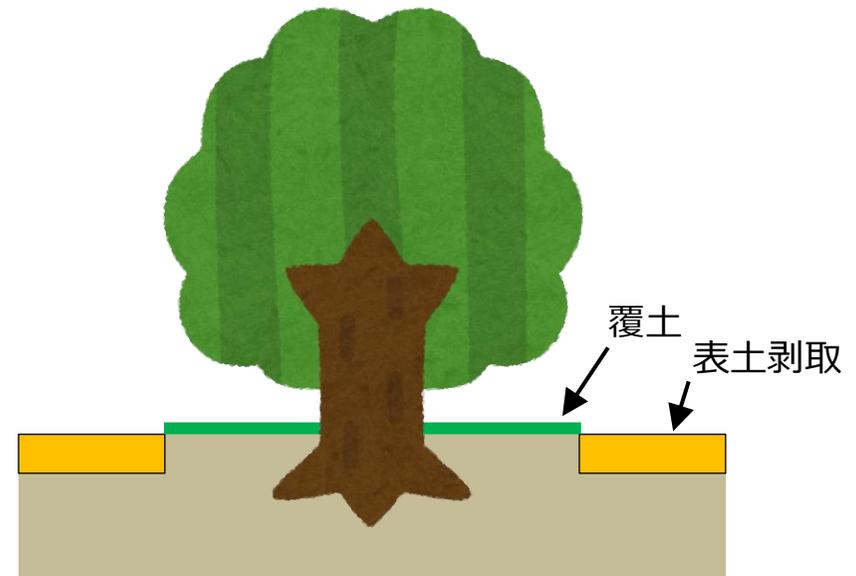


実施時期: 2019年2月～2019年6月  
平均空間線量率(1m)  
1.41 $\mu$ Sv/h $\rightarrow$ 0.50 $\mu$ Sv/h(低減率: 64.3%)

## ○先行解除範囲（案）の除染実施時期



# 拠点の除染/建物解体の今後のスケジュール

状況に応じ計画は変更する可能性があります

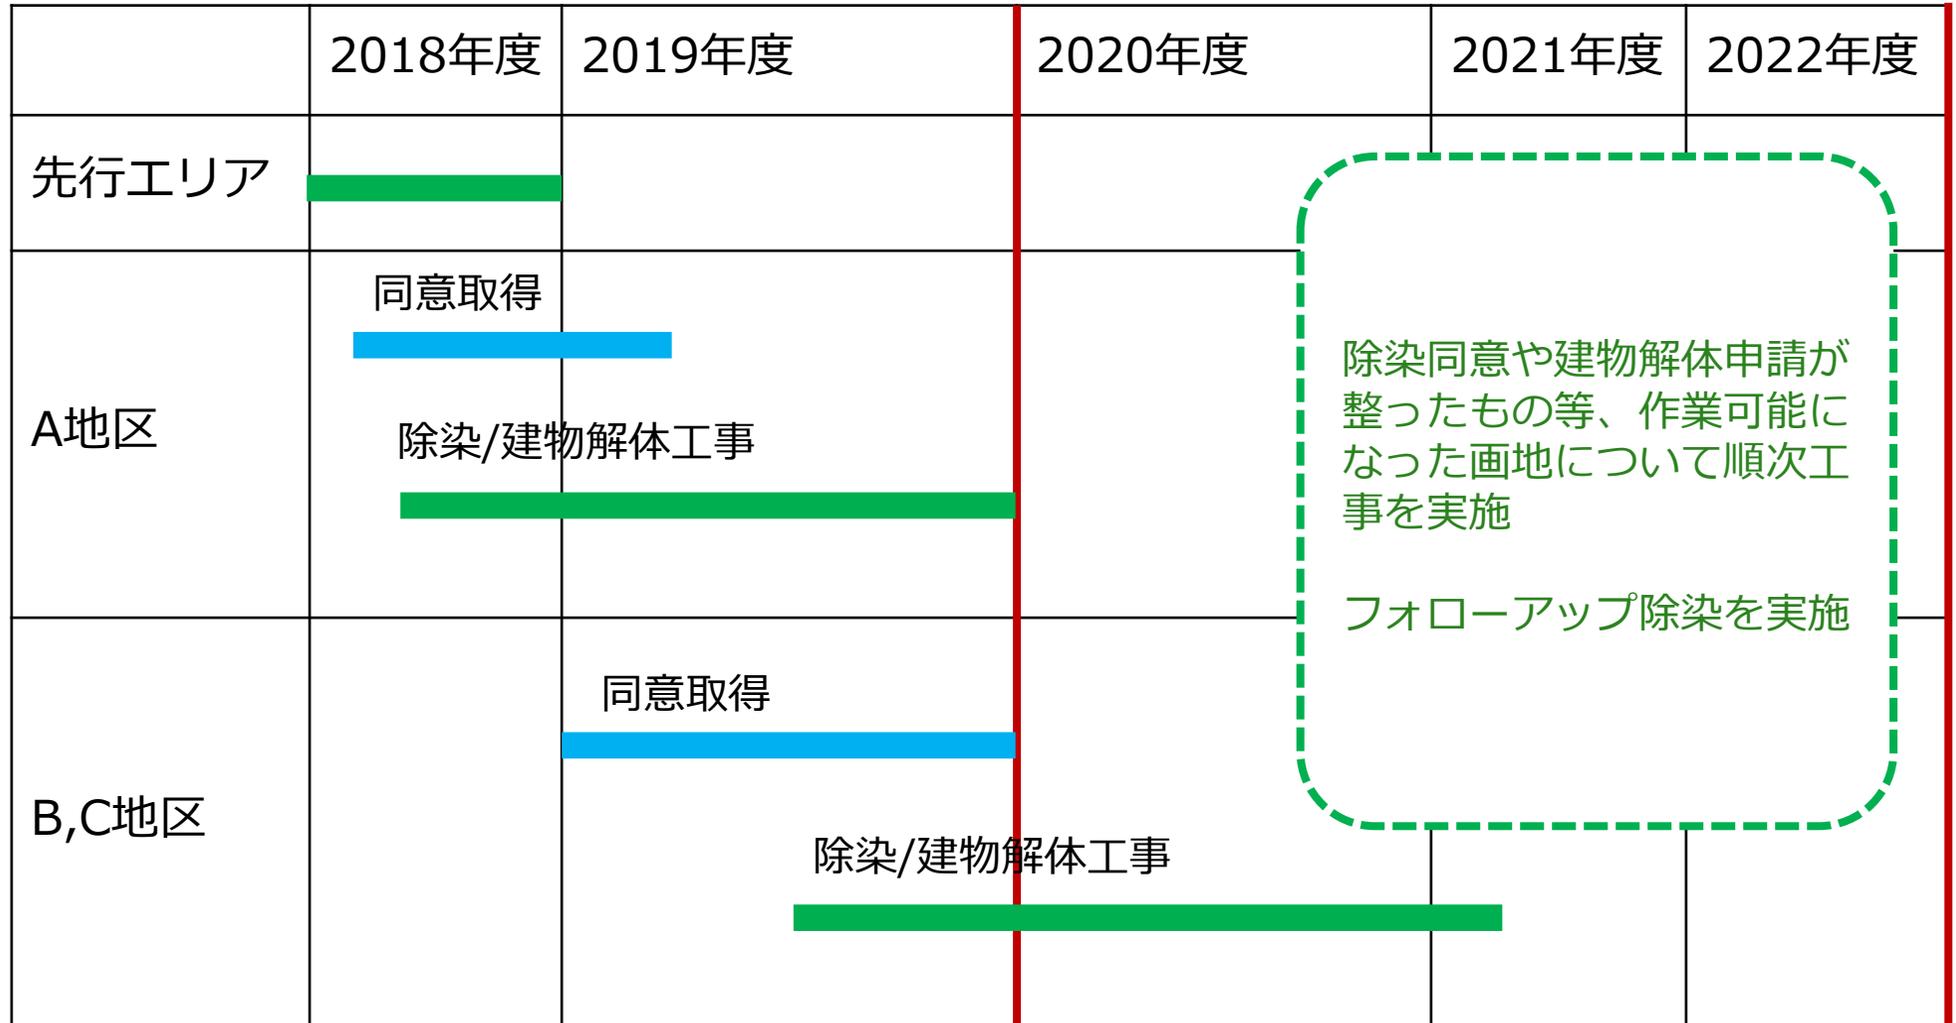

2019年度末頃：夜ノ森  
駅周辺の避難指示解除

2023年春頃：  
避難指示解除

