


富岡町における 除染の進捗状況について

令和元年9月6日 環境省 福島地方環境事務所



避難指示解除済区域における除染について

- **フォローアップ除染**

- 町民からのお問い合わせ案件 対応完了517件／535件
- 事後モニタリング結果からの抽出案件 対応完了586件／600件
 - ※対応完了：施工完了もしくは現地調査の結果施工不要となった案件

- **解体工事進捗状況**

- 平成30年度まで：2,504件解体完了
- 今年度：12月末までの要解体件数 171件（= ① - ② - ③ - ④）

当初発注	320件
申請実数	389件
	うち固定資産税免除対象（平成30年12月末までの申請） 297件①
	うち申請者都合による保留・延期 45件②
解体完了	39件③
解体作業中	42件④

特定復興再生拠点区域における除染について

○除染関係


- ・夜の森先行地区：30年度後半の解体着手画地、未同意画地等を除き完了
- ・A地区：同意取得率…85.2%（8/26時点）
公道、夜の森つつみ公園、農地等について除染実施中。
- ・BC地区：解体撤去等及び除染等工事契約済
（工期：令和元年8月1日～令和2年3月16日）

○解体関係


- ・夜の森先行地区：解体申請数212件、解体完了166件
- ・A地区：解体申請数289件、解体完了104件
- ・BC地区：解体申請数58件

先行解除範囲の空間線量率（1m）

除染前

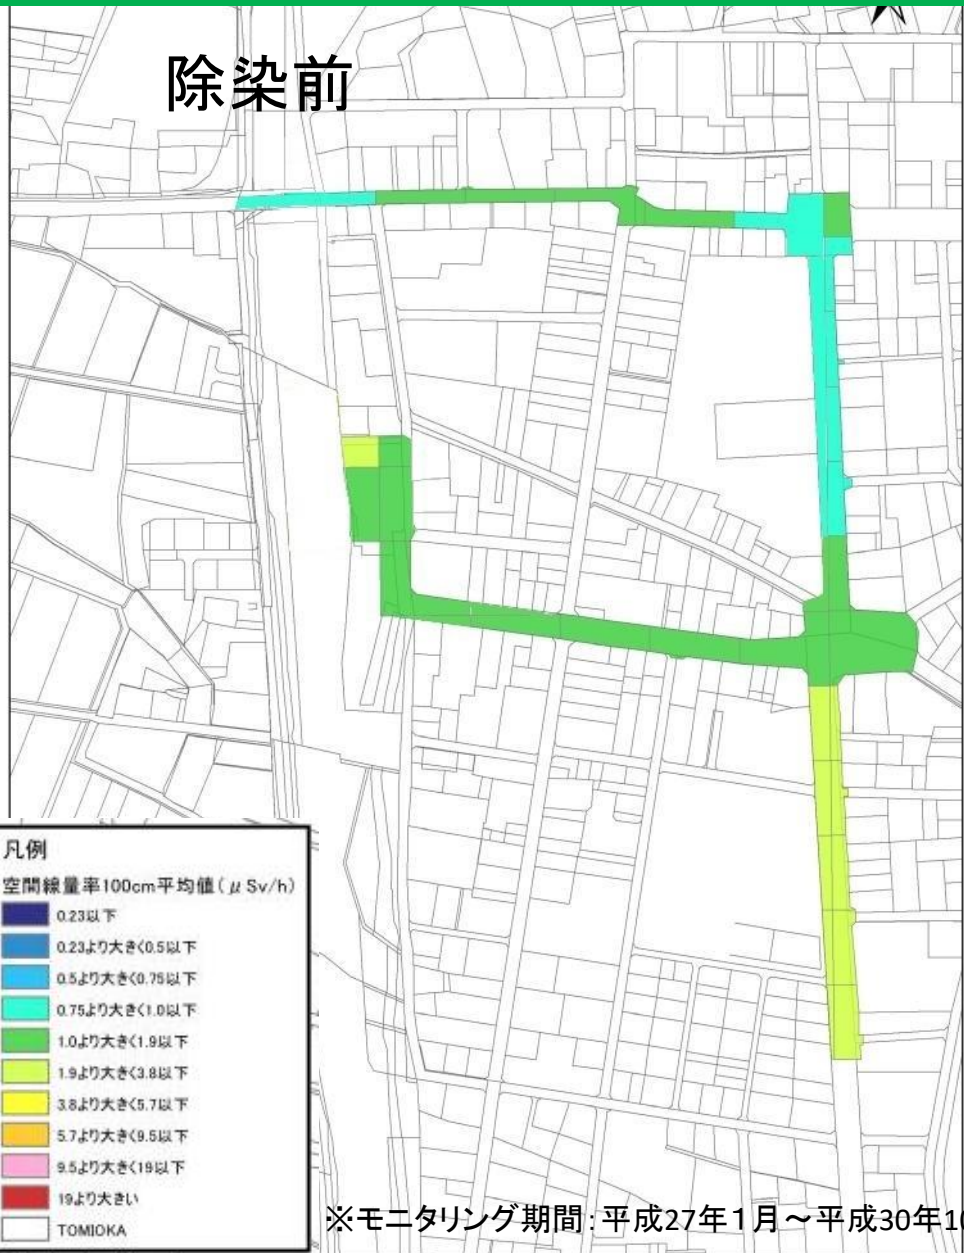


除染後

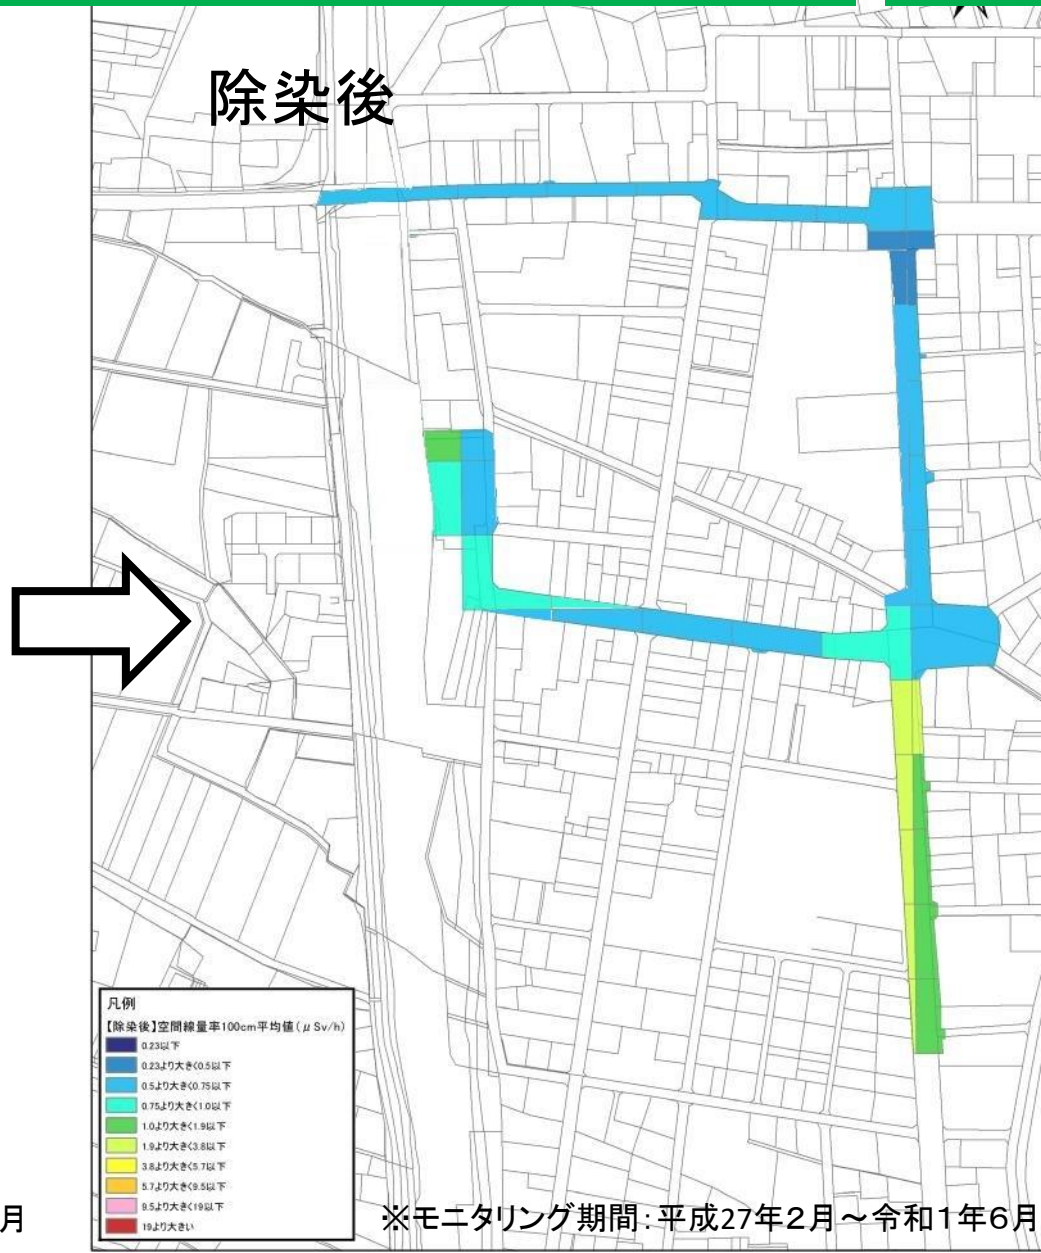



※モニタリング実施期間: 令和1年8月

- 最新測定結果によると、1 m空間線量率が**1.89 μ Sv/h**から**0.57 μ Sv/h**に低減（低減率70%）しました。

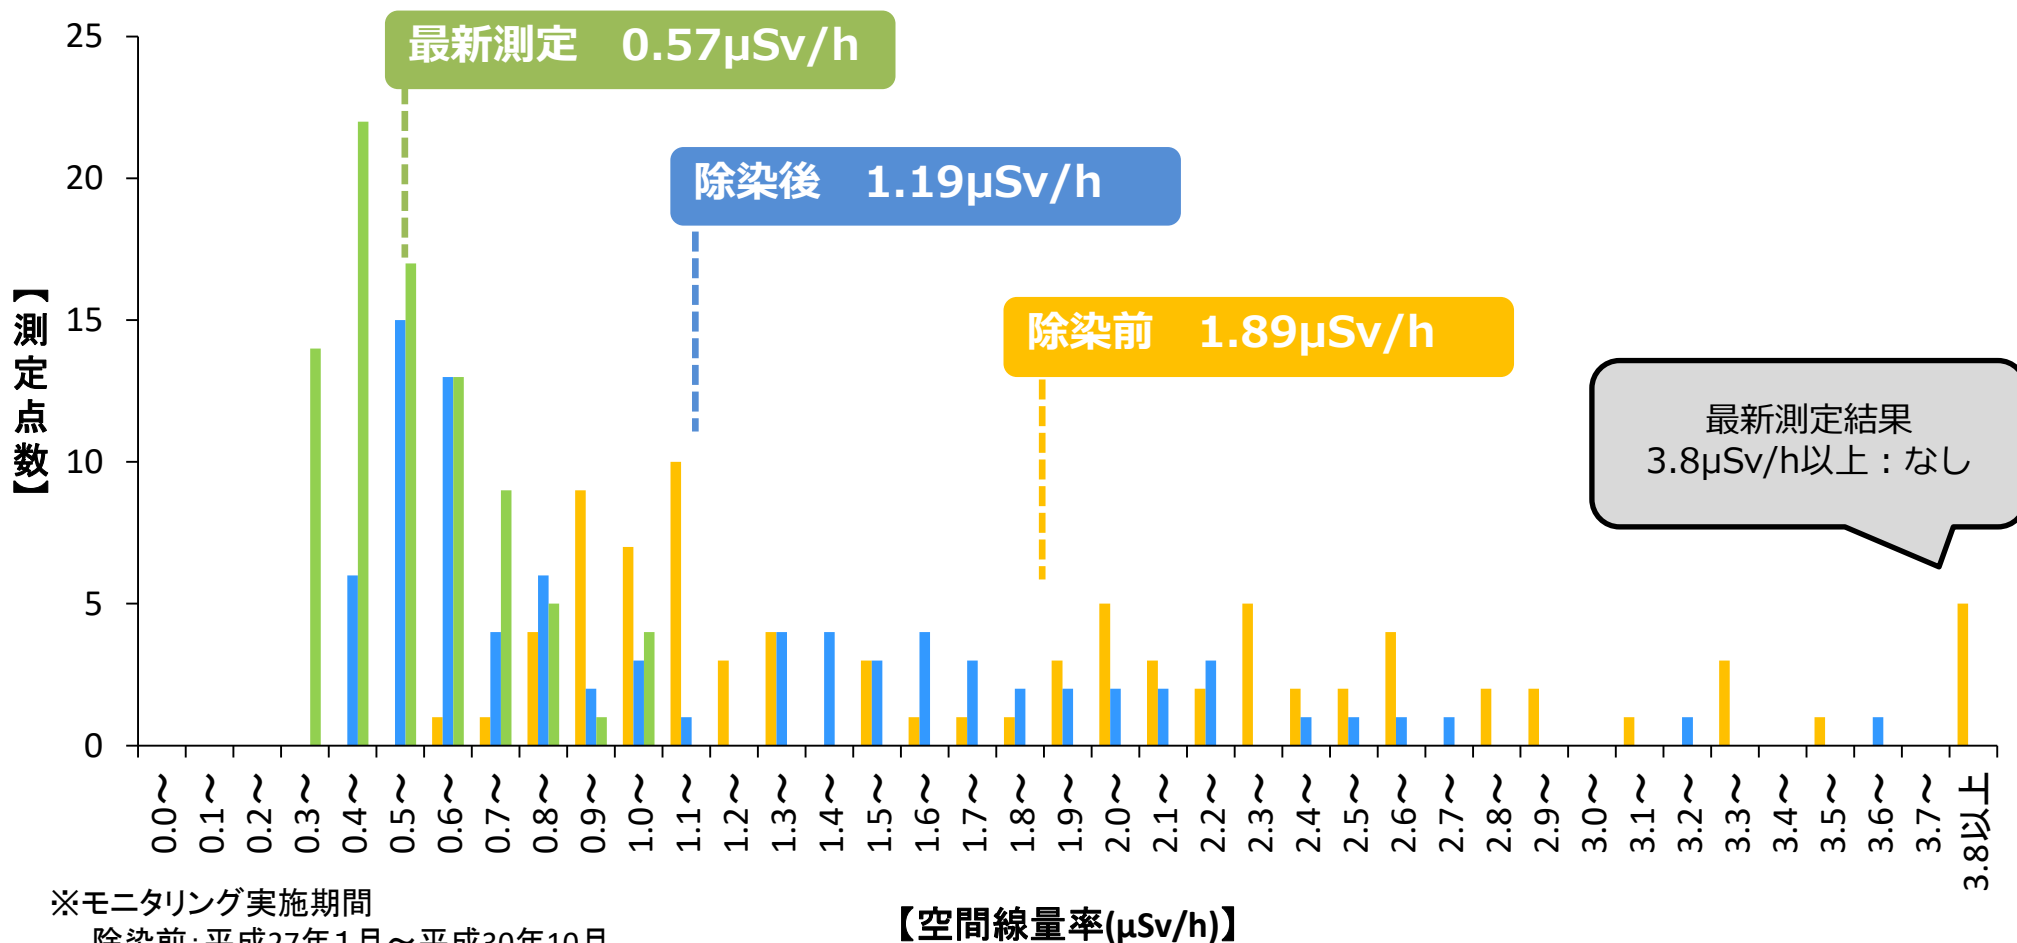

※モニタリング実施期間

除染前：平成27年1月～平成30年10月


除染後：平成27年2月～令和1年6月

最新測定：令和1年8月

【空間線量率(μ Sv/h)】

拠点の除染/建物解体の今後のスケジュール

状況に応じ計画は変更する可能性があります

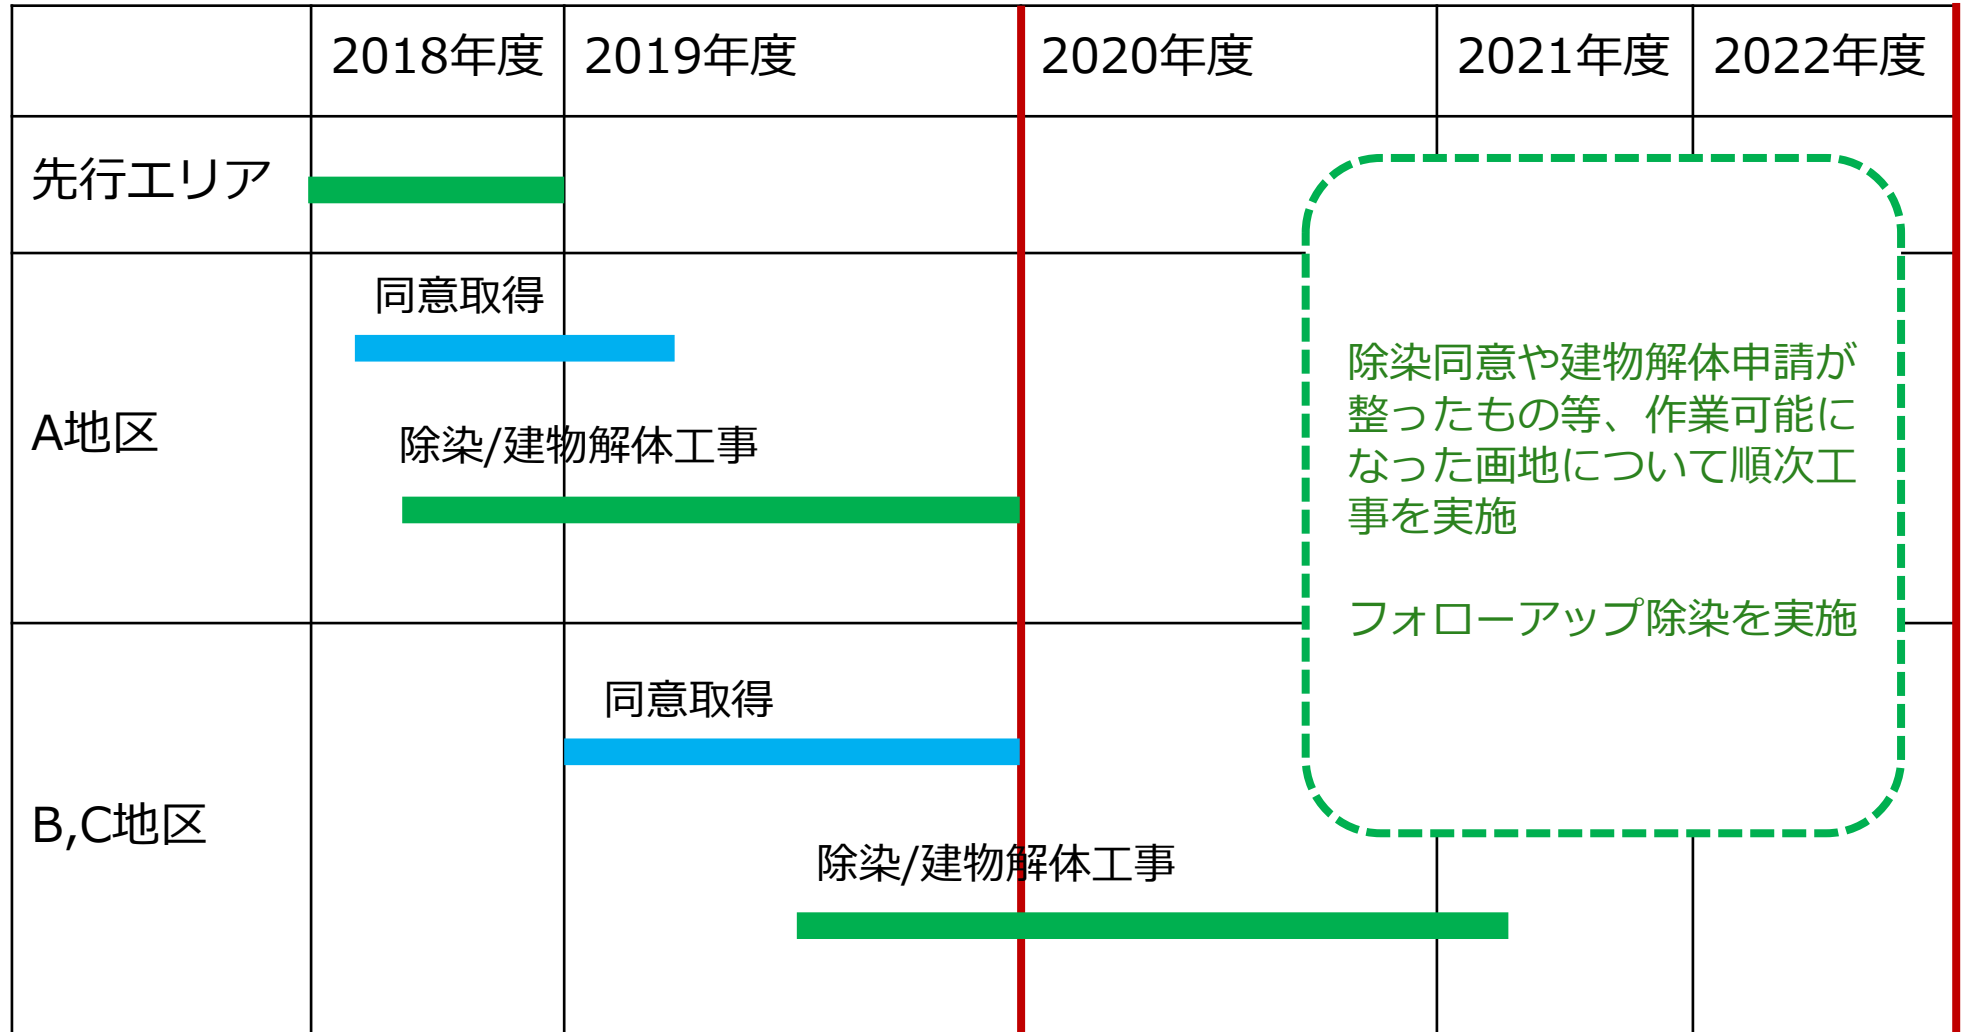

2019年度末頃：夜ノ森
駅周辺の避難指示解除

2023年春頃：
避難指示解除

