


富岡町における 除染の進捗状況について

令和元年11月8日 環境省 福島地方環境事務所

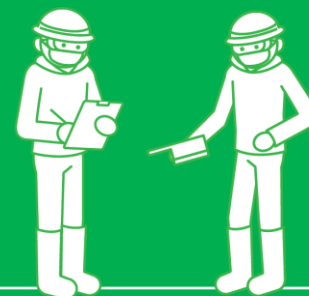

○避難指示解除済区域

・フォローアップ除染

- － 町民からのお問い合わせ案件 対応完了520件／538件
- － 事後モニタリング結果からの抽出案件 対応完了596件／600件
- － その他公道等 対応完了139件／139件

※対応完了：施工完了もしくは現地調査の結果施工不要となった案件

・解体工事進捗状況

- － 申請件数：2,905件
- － 解体完了件数（9月末時点）：2,585件

○特定復興再生拠点区域

・除染関係

- － 夜の森先行地区：30年度後半の解体着手画地、未同意画地等を除き完了
- － A地区：同意取得率…85.5%
- － BC地区：同意取得率…48.1%

・解体関係


- － 夜の森先行地区：解体申請数218件、解体完了181件
- － A地区：解体申請数305件、解体完了133件
- － B C地区：解体申請数62件
うち先行解除道路に面している解体案件 解体申請数58件、解体完了44件

先行解除範囲の空間線量率（1m）



前

2


除染前

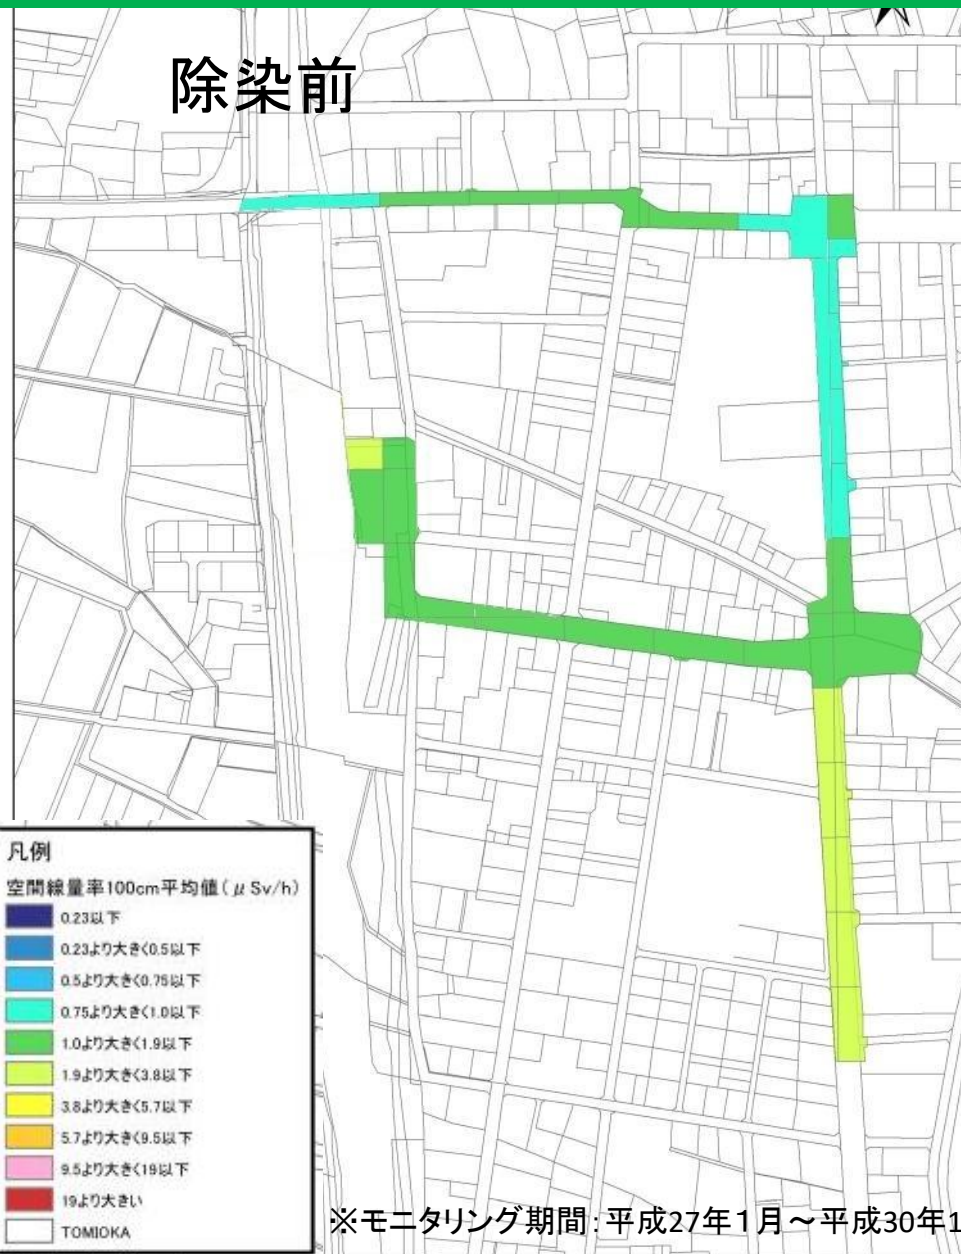

最新測定結果

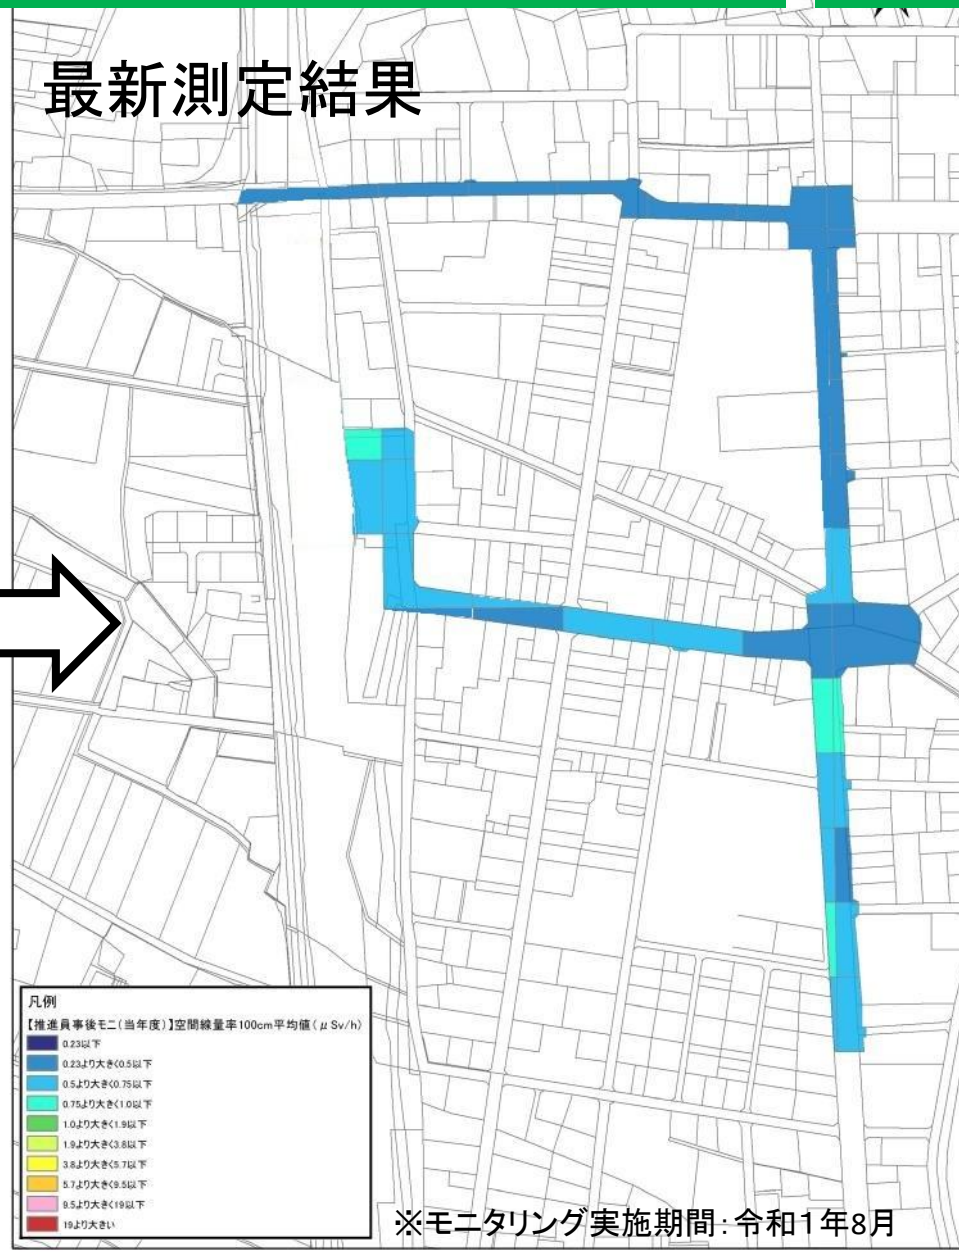

- 最新測定結果によると、1 m空間線量率が**1.89 μ Sv/h**から**0.57 μ Sv/h**に低減（低減率70%）しました。

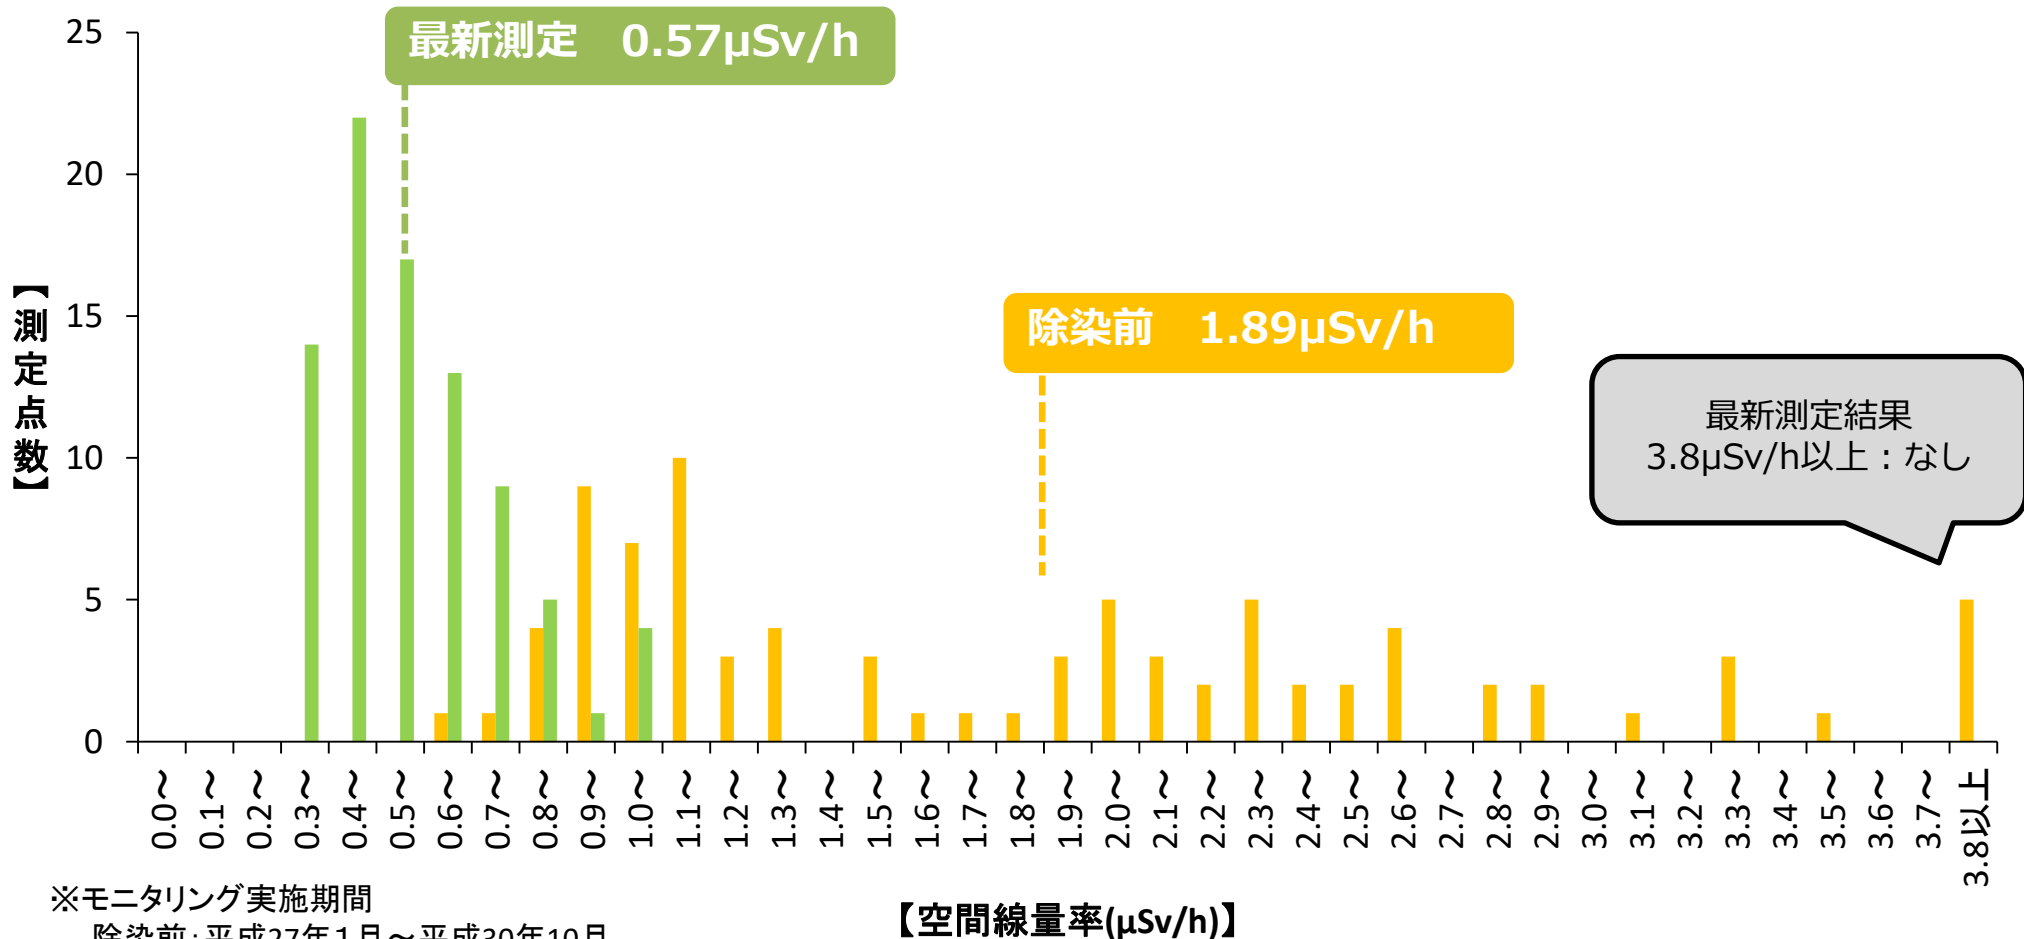

※モニタリング実施期間


除染前：平成27年1月～平成30年10月

最新測定：令和1年8月

拠点の除染/建物解体の今後のスケジュール

4

状況に応じ計画は変更する可能性があります

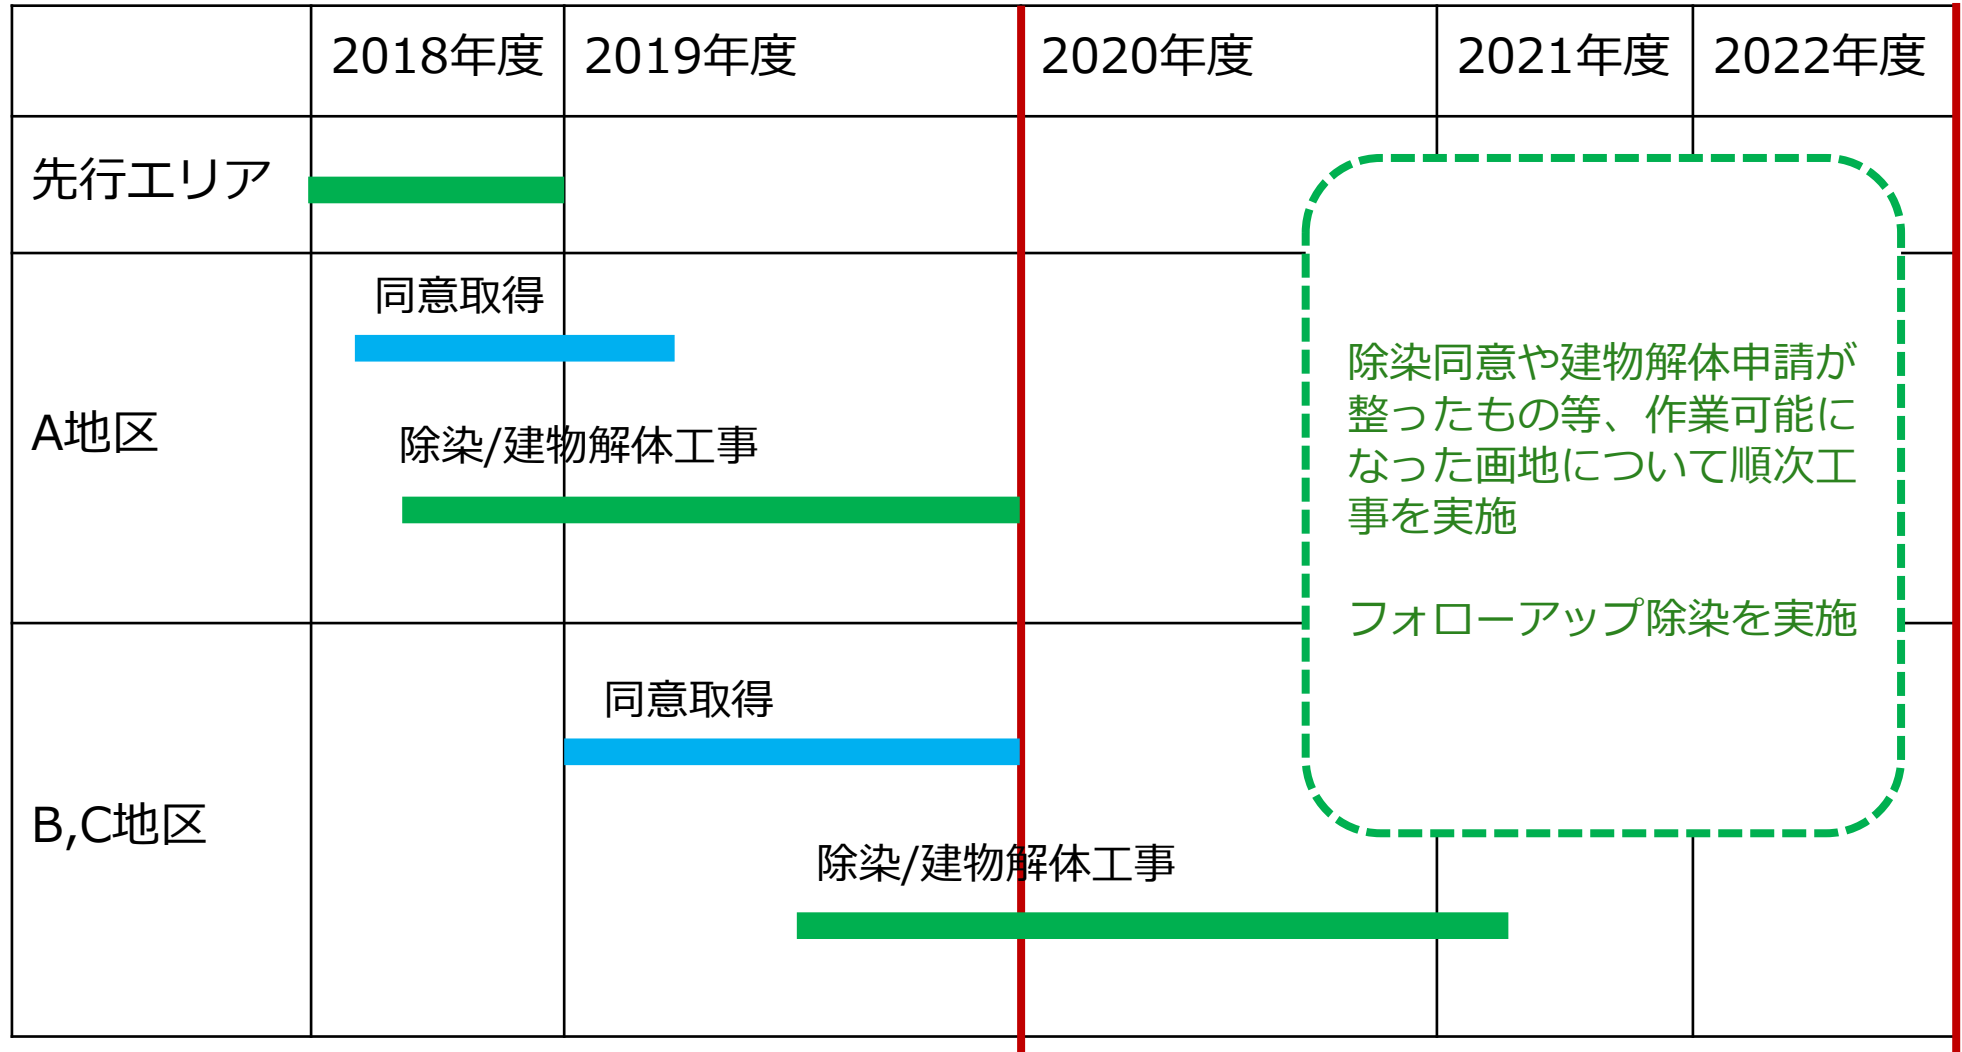

2019年度末頃：夜ノ森
駅周辺の避難指示解除

2023年春頃：
避難指示解除

