

# 点拠点・線拠点及びその外縁 の除染及びフォローアップ内容

令和5年8月 環境省 福島地方環境事務所





**◀◀除染▶▶**

**(線拠点)**

- **町道3090号線、町道3091号線**

**◀◀フォローアップ除染▶▶**


**(線拠点及び外縁)**

- 1. 松ノ前道路**
- 2. 町道1007号線、町道2004号線**

**(点拠点外縁)**

- **小良ヶ浜共同墓地**

1. 町道3090号線、町道3091号線（線拠点）

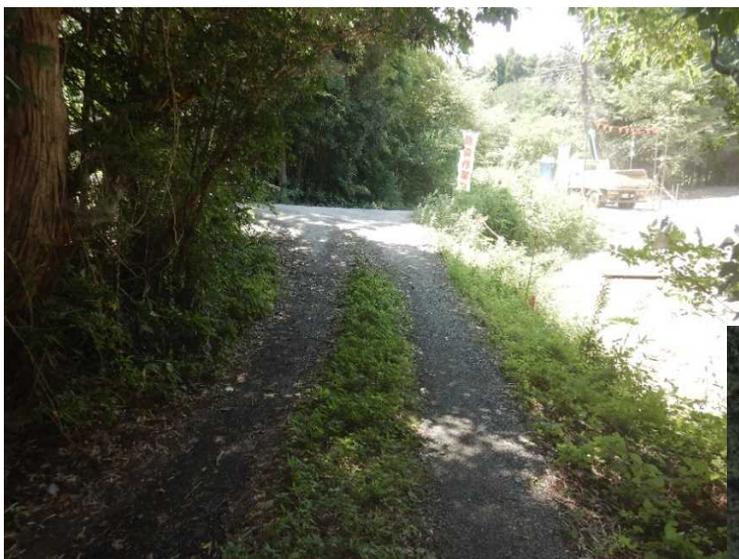

【現状】

＜町道3090号線北側、町道3091号線＞


・道路本体及び法面は未除染。

（最大3.2 $\mu$ Sv/h）

・周辺外縁部は森林、農地及び宅地。同意を得られたところから除染作業中。



1. 町道3090号線、町道3091号線（線拠点）

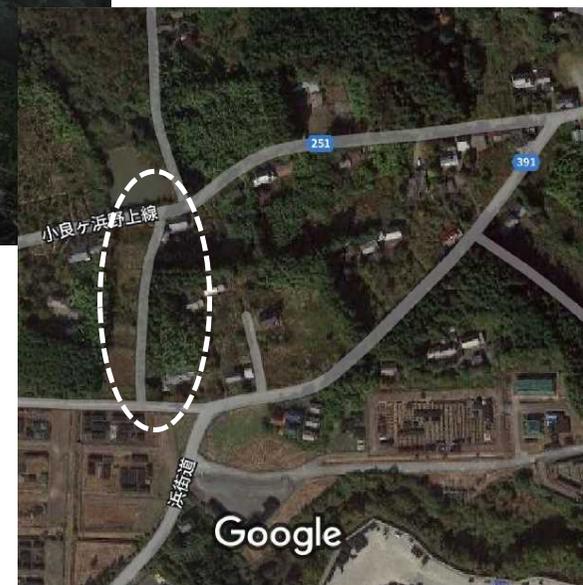

【現状】 <町道3090号線南側>

- ・道路本体及び法面は未除染（最大 $1.3\mu\text{Sv/h}$ ）。
- ・周辺外縁部は農地及び宅地。県道事業と重複する箇所を除き、除染作業中。

# 点拠点・線拠点及びその外縁における除染内容

## 1. 町道3090号線、町道3091号線（線拠点）



- 【対応方針】**
- <11月末完了予定>**
- ・舗装路は堆積物除去、高圧水洗浄等を実施方針。
  - ・未舗装路は堆積物除去、碎石の洗浄・再敷設を実施。
  - ・道路法面は、除草及び堆積物除去、構造物の高圧水洗浄を実施。

2. 松ノ前道路（線拠点）



【現状】

- ・ 除染済。除染後の歩行モニタリングで、全体的に比較的高線量箇所であることを確認（最大 $1.6\mu\text{Sv/h}$ ）。

## 2. 松ノ前道路（線拠点）



### 【対応方針】 <9月以降着手、11月末完了予定>

- ・フォローアップ除染として、面的に線量を下げるために、道路周辺の森林において敷地境界から5m範囲で5cmの表土削り取りを実施。

## 3. 町道1007号線、町道2004号線




### 【現状】

- ・ 歩行モニタリングで比較的高線量箇所を確認（最大 $1.2\mu\text{Sv/h}$ ）。
- ・ 道路本体は除染済。道路路肩、法面は未除染。
- ・ 道路周辺に未同意敷地が複数存在。



## 3. 町道1007号線、町道2004号線

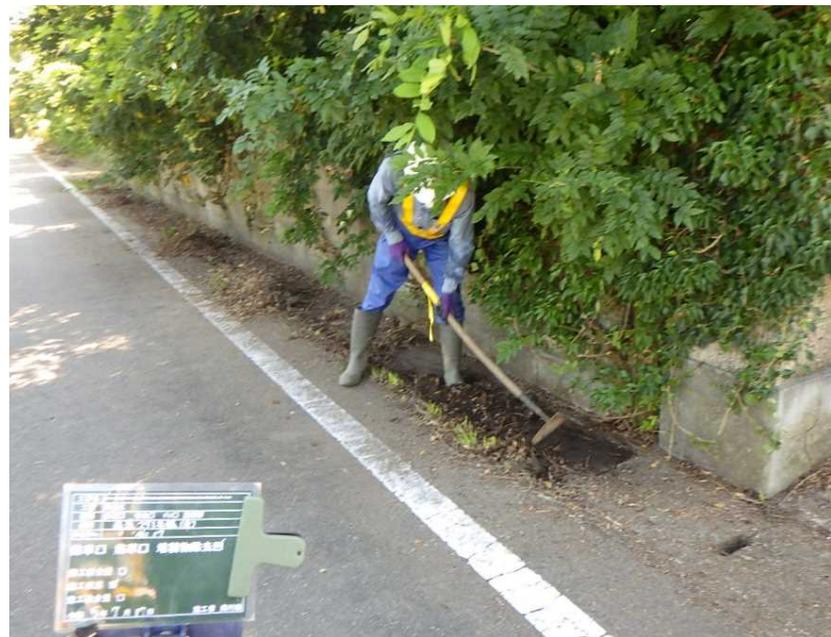

### 【対応方針】

＜9月着手、10月未完了予定＞

- ・道路法面は、除草及び堆積物除去、構造物の高圧水洗浄を実施。
- ・未同意敷地は、同意を得られるよう引き続き関係人にアプローチしていく。

3. 小良ヶ浜共同墓地




【現状】


①墓地と周辺の森林との境界部において、面的に線量が高いことが認められた。

②除染後も、敷地境界部の一部（上記丸で囲われた箇所）で高線量箇所（ホットスポット）が確認された。（最大4.74 $\mu$ sV/h）


→拠点内の線量が高いことは、周辺の森林由来と考えられる。

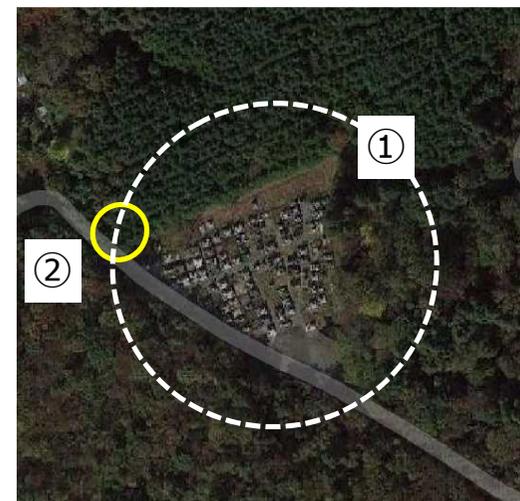

3. 小良ヶ浜共同墓地

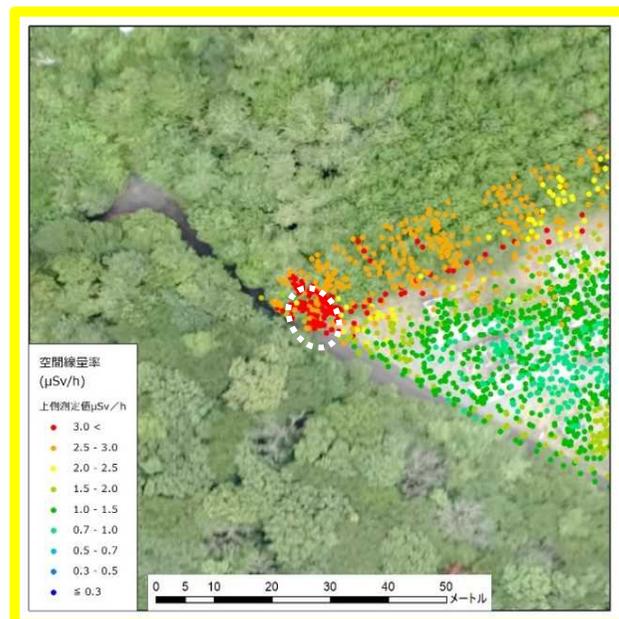

※ホットスポット (白丸箇所)  
4.74μSv/h (地上 1 m高)

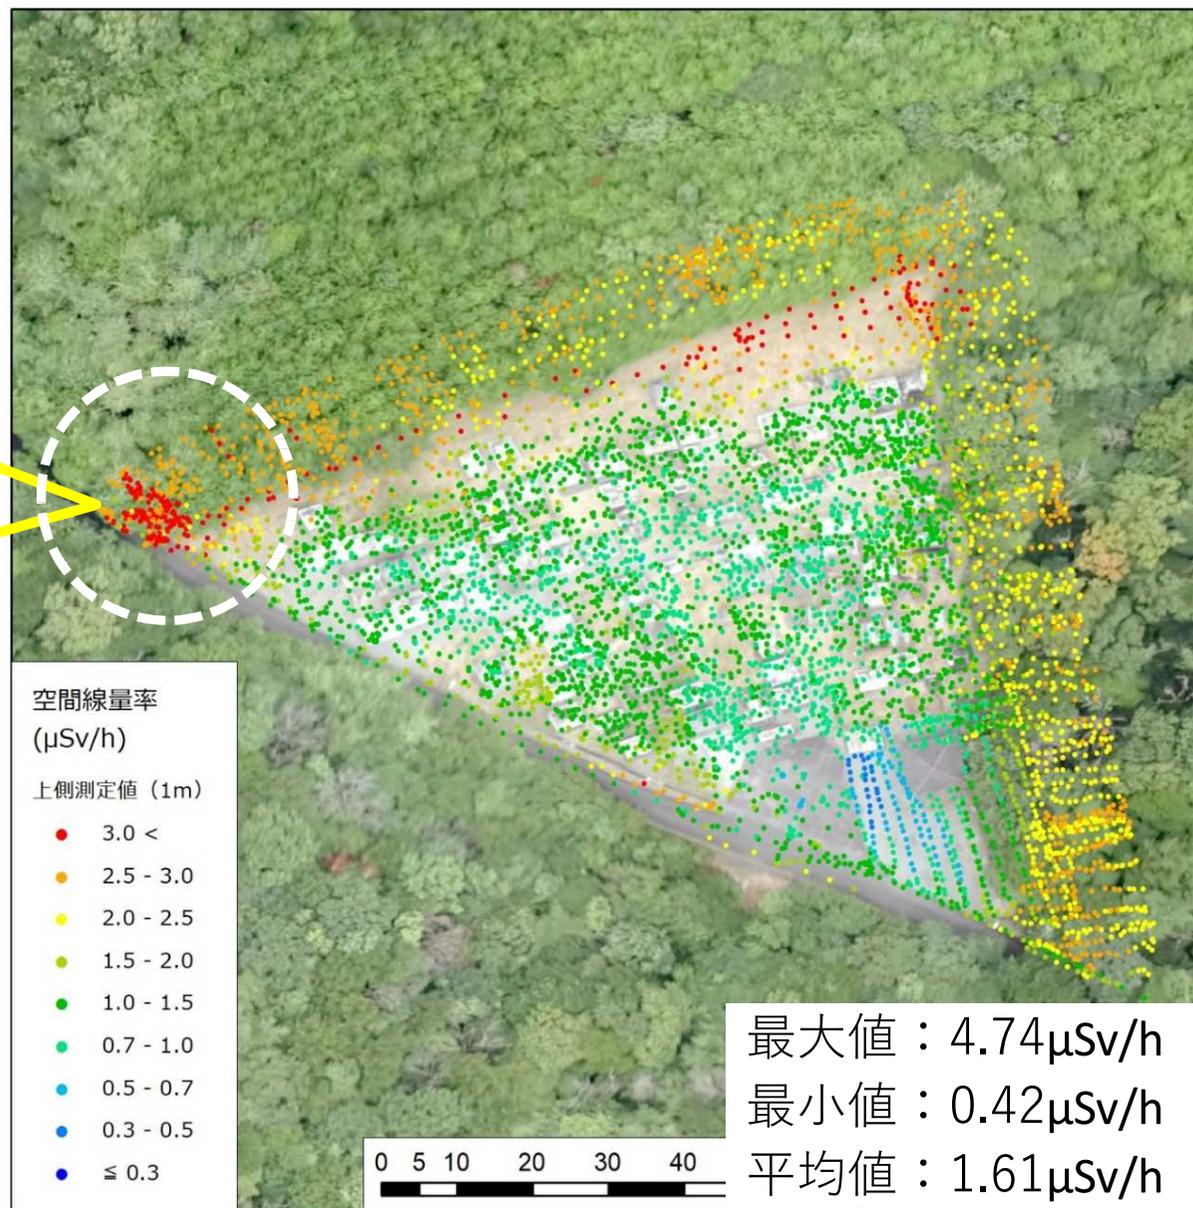


3. 小良ヶ浜共同墓地



【対応方針】 <9月完了予定>

- ①共同墓地内（拠点内）の線量を下げるために、墓地周辺の森林において敷地境界から5m範囲において、5cmの表土削り取りを実施。
- ②高線量箇所（ホットスポット）の線量を下げるために、線量及び削り取り箇所の状況によって、最大30cmの削り取りを行う。

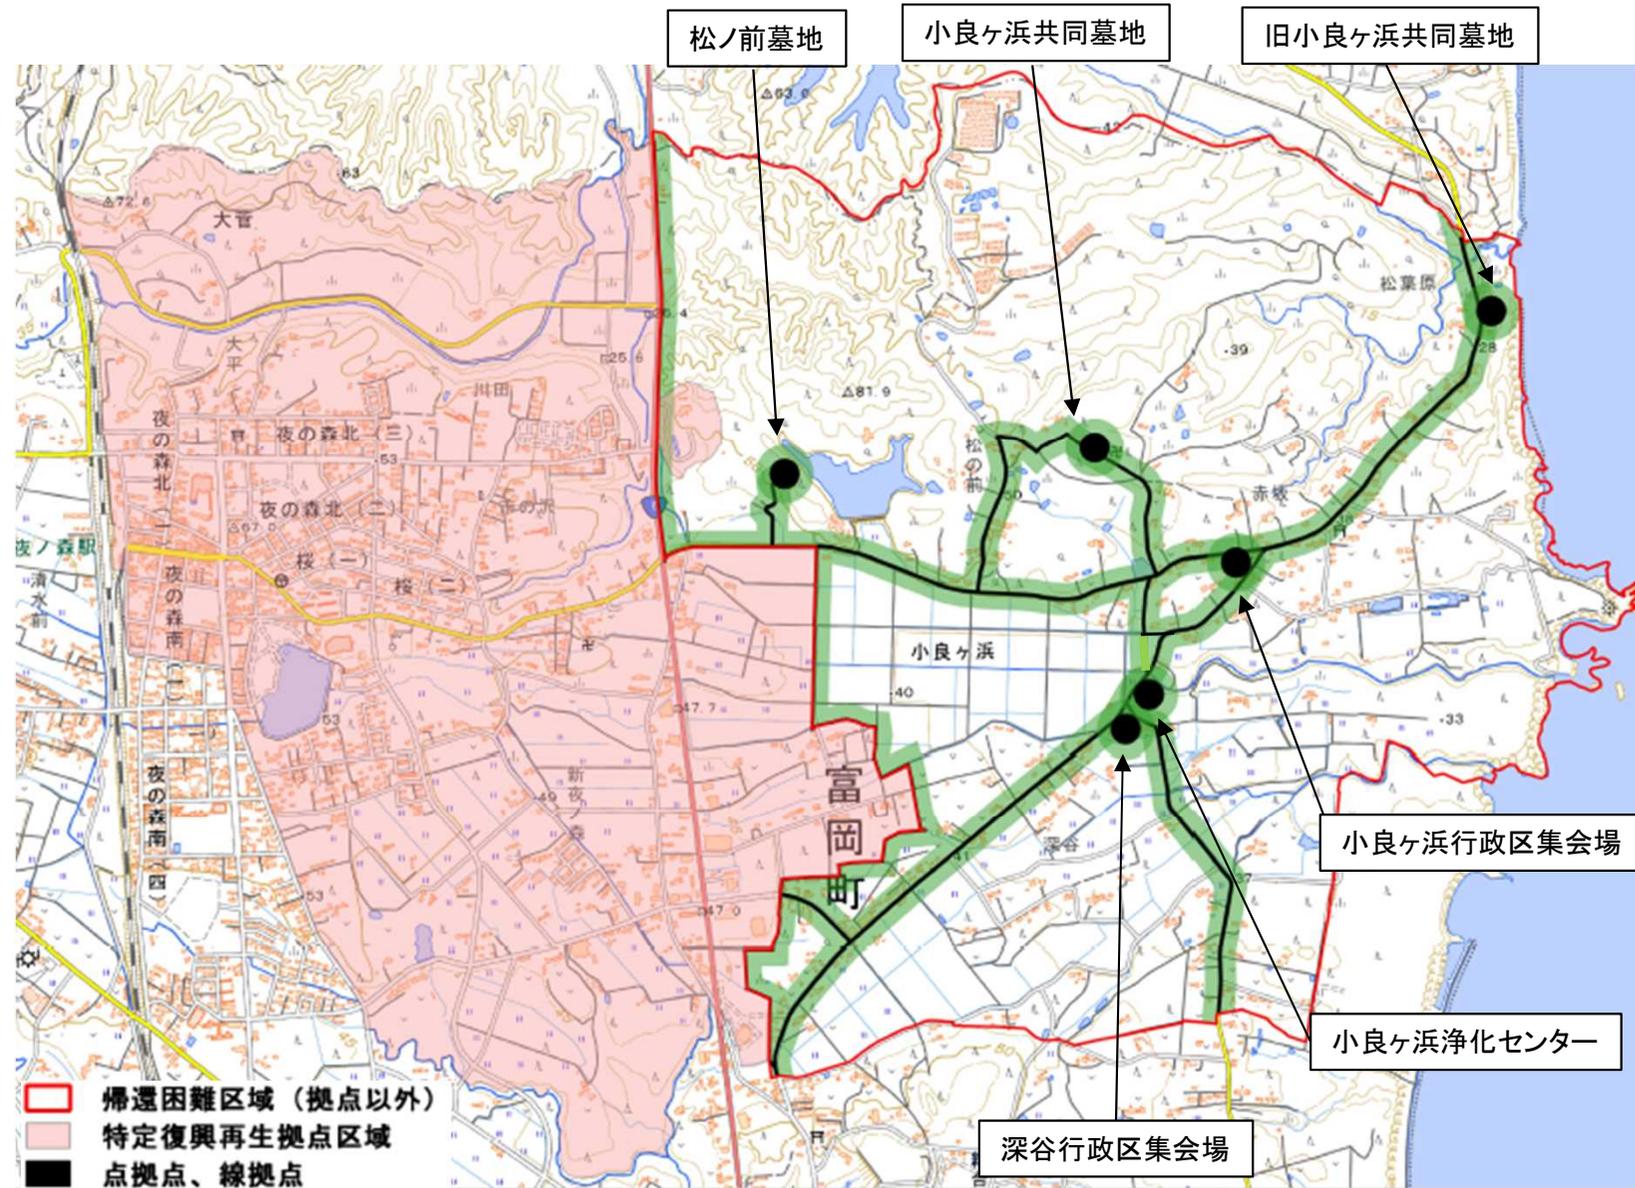

外縁除染範囲 (仮置場除く)

原則として特定復興再生拠点から、宅地・農地は20m範囲内にある一筆を除染、森林・道路は最大20mの範囲を除染。

