



# 富岡町における除染の進捗状況について

令和6年10月11日 環境省 福島地方環境事務所



# 特定帰還居住区域、特定復興再生拠点区域等位置図

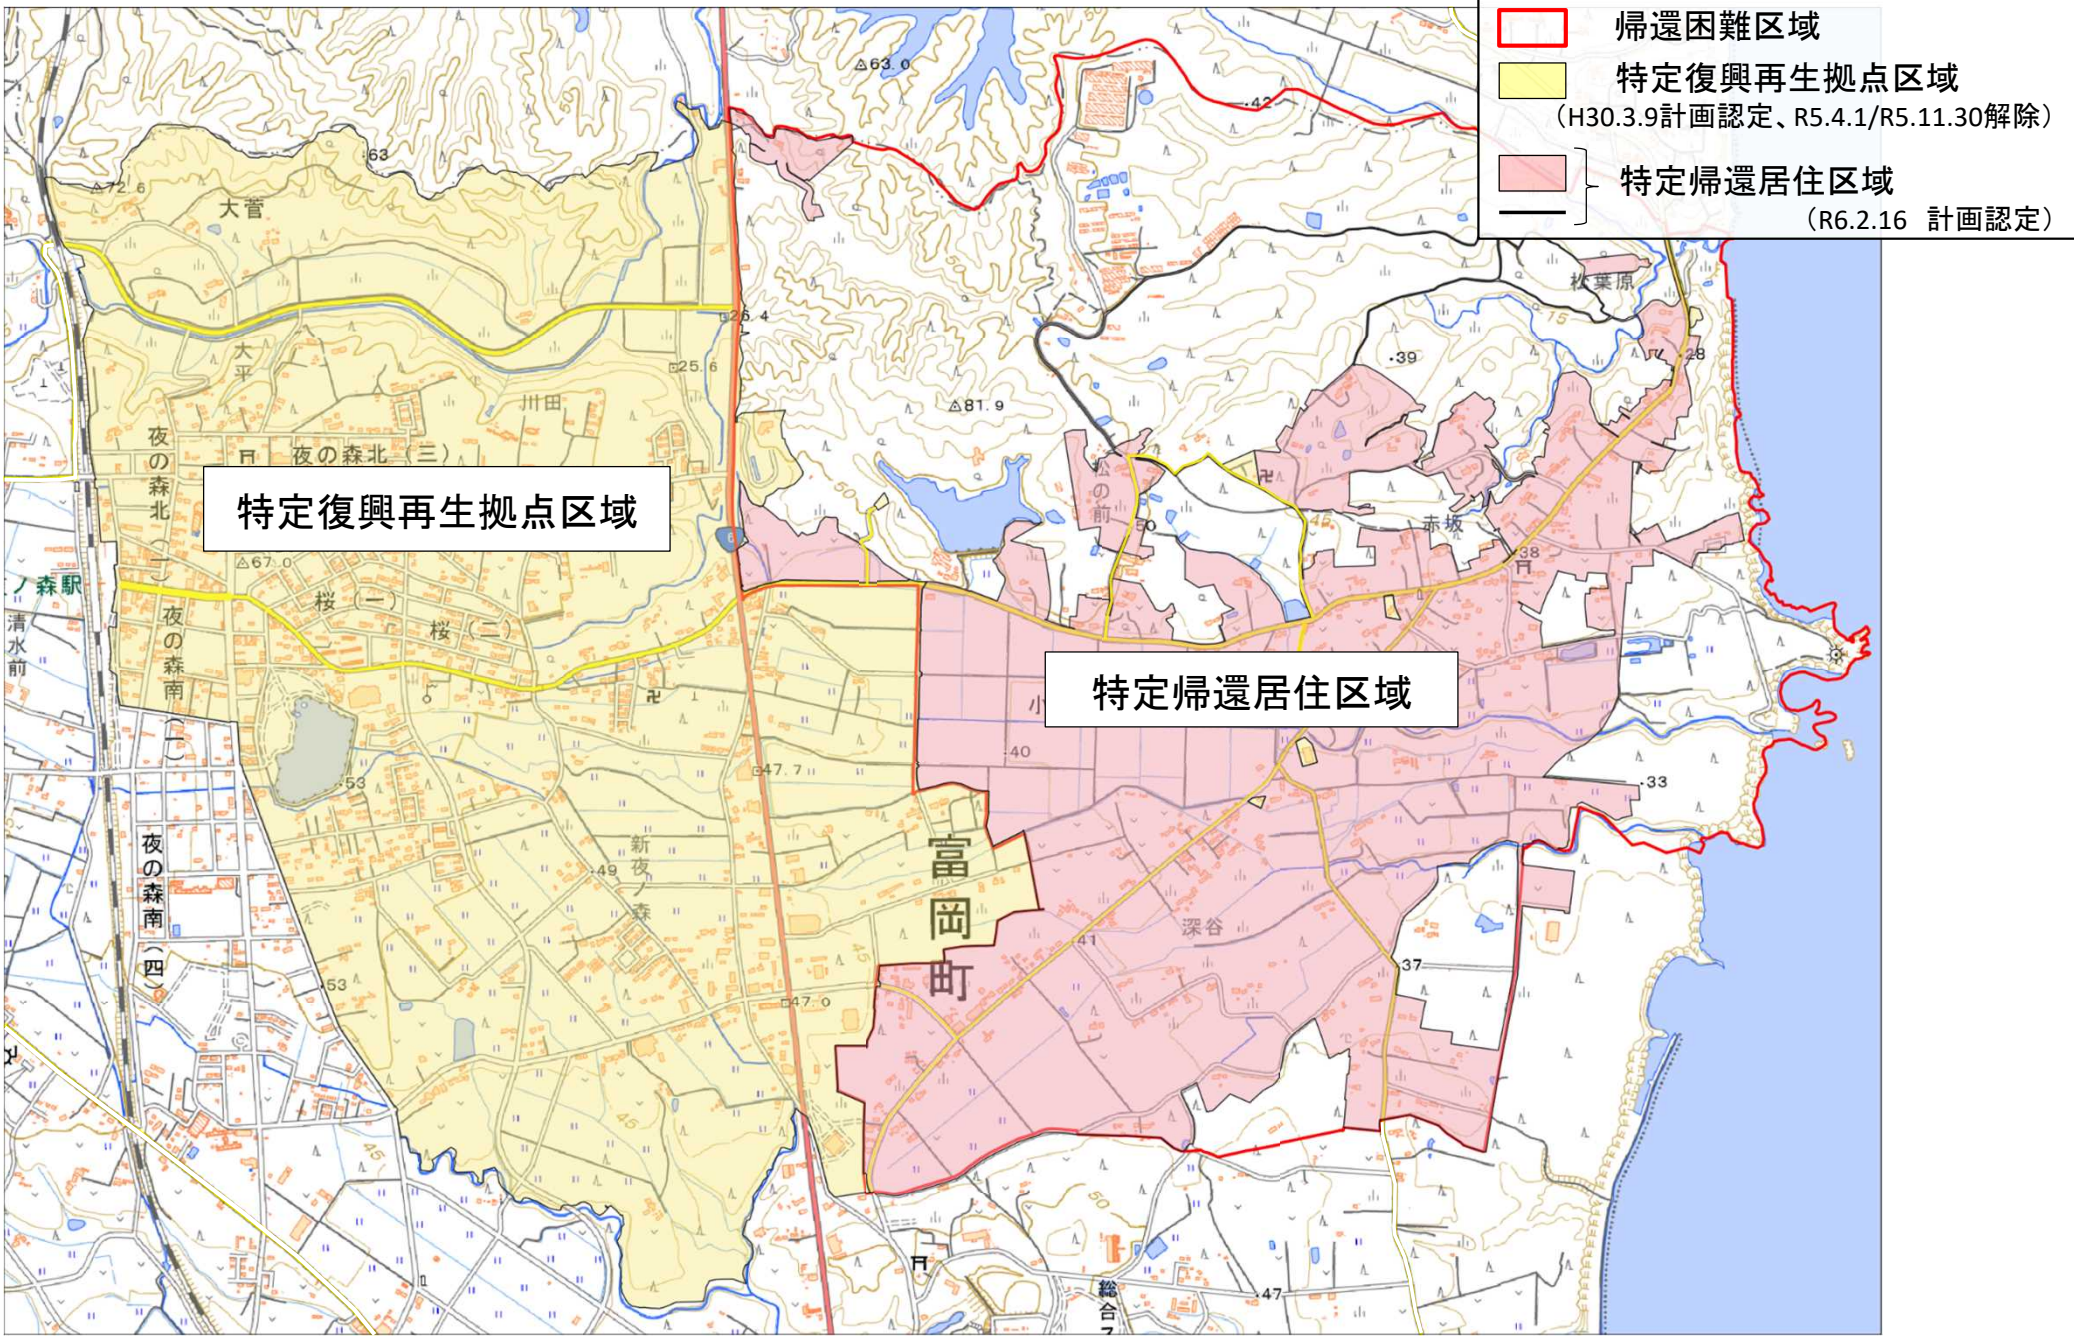

解除に向け、円滑に除染・解体が進められるよう、特定帰還居住区域復興再生計画の認定（令和6年2月16日）後、県道事業や町のインフラ整備とも調整し、速やかに必要な準備を進めているところ。

## ・解体申請受付

計画認定後、直後から受付開始。該当者への案内、町広報誌への掲載など、制度をご理解いただけるよう周知を図っているところ。

（9月30日時点）64件対応中（40件正式受付、24件相談対応中）

## ・除染同意取得

関係人を把握した上で、同意書案に記載する建物の配置や土地の状況等を調べる事前調査を実施中。

同意書案が出来たところから、順次、関係人に除染に同意いただけるようお願いさせていただいているところ。

## ・工事進捗、発注

«令和6年度富岡町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その1）»

工期：令和6年5月31日～令和7年3月31日

対象：50件解体、21ha除染予定。（拠点分含む）

受注者：五洋建設株式会社

令和6年9月5日 除染作業着手



○解体 (令和6年9月30日時点)

解体申請数 40件、解体完了 ー件、着工中 ー件  
 なお、「解体完了」件数は上屋解体が完了した数

○除染 (令和6年8月末日 速報値)

◆避難指示解除済区域 (フォローアップ除染等)

・町による線量率測定結果等を踏まえて、個別のホットスポット解消に向けて取り組んでいるところ

◆特定帰還居住区域除染工事進捗状況 (令和6年7月末日 速報値)

地目	除染対象面積 (仮置場除く)	既除染面積		除染進捗率  (b+c)/a
		旧拠点外縁部	旧拠点外縁以外	
	a	b	c	
宅地	12.4 ha	4.7 ha	—	38 %
農地	48.3 ha	17.8 ha	—	37 %
森林	45.6 ha	8.7 ha	—	19 %
道路	9.2 ha	6.1 ha	—	67 %
全体	115.5 ha	37.3 ha	—	32 %

※いずれも速報値のため、今後の精査で変わりうる。

## 特定帰還居住区域 区域内（令和6年8月末時点） ‹‹旧拠点外縁部含む、仮置場除く››

	対象	同意	取得率
	人	人	%
合計	425	245	56.7

※いずれも速報値のため、今後の精査で変わりうる。

- ・ 県道拡幅事業等、インフラ整備が予定されている箇所について、優先的に作業着手出来るよう同意取得作業を進めているところ。

## 特定帰還居住区域 外縁（令和6年8月末時点）

	対象	同意	取得率
	人	人	%
合計	113	0	0

※いずれも速報値のため、今後の精査で変わりうる。

- ・ 県道拡幅事業等、インフラ整備が予定されている箇所について、優先的に作業着手出来るよう同意取得作業を進めているところ。

- 面拠点、点・線拠点部分については、概ね除染は完了。
- 点・線拠点外縁についても、概ね除染は完了。なお、除染できていない箇所は関係人未同意、同一敷地内建造物の解体待ち等の理由による除染同意済み着手不能箇所、及び県事業である県道小良ヶ浜野上線の拡幅工事及び県道広野小高線のバイパス工事の対象箇所との重複箇所。  
引き続き、町や県と連携を進め同意が得られ次第、または工事に係る調整が済み次第、着手。
- 除染が完了した後も、比較的線量が高い箇所、懸念の声があった箇所については引き続き現地調査を実施し、線量低減が可能であればフォローアップ除染で対応していく。

## ◀ 特定復興再生拠点区域内 ▶

### ○ 拠点区域内解体（令和6年9月30日時点）

解体申請数982件、解体完了896件、着工中 6件  
 なお、「解体完了」件数は上屋解体が完了した数

### ○ 拠点区域内除染（令和6年8月末日 時点）

	除染対象面積	完了面積	除染進捗率
全体	319 ha	311 ha	98 %

### ○ 同意取得状況

	対象	同意	取得率
全体	1,520 人	1,503 人	99 %
