


富岡町における 除染の進捗状況について

平成31年3月26日 環境省 福島地方環境事務所



避難指示解除済エリアにおける除染について

- **夜の森（先行地区）の除染**

- 30年度後半の解体着手画地、未同意画地等を除き完了

- **フォローアップ除染**

- 町民からのお問い合わせ案件 対応完了480件／519件
- 事後モニタリング結果からの抽出案件 対応完了529件／600件

※対応完了：施工完了もしくは現地調査の結果施工不要となった案件

- **事後モニタリング**

- 実施対象：避難指示解除済エリア
- 進捗：完了


H30 事後モニタリング結果（1m）

2

30年度の事後モニタリング結果によると、宅地では1 m空間線量率が
1.98 μ Sv/hから**0.35 μ Sv/h**に低減（低減率82%）しました。

【1 m空間線量率】


(μ Sv/h)

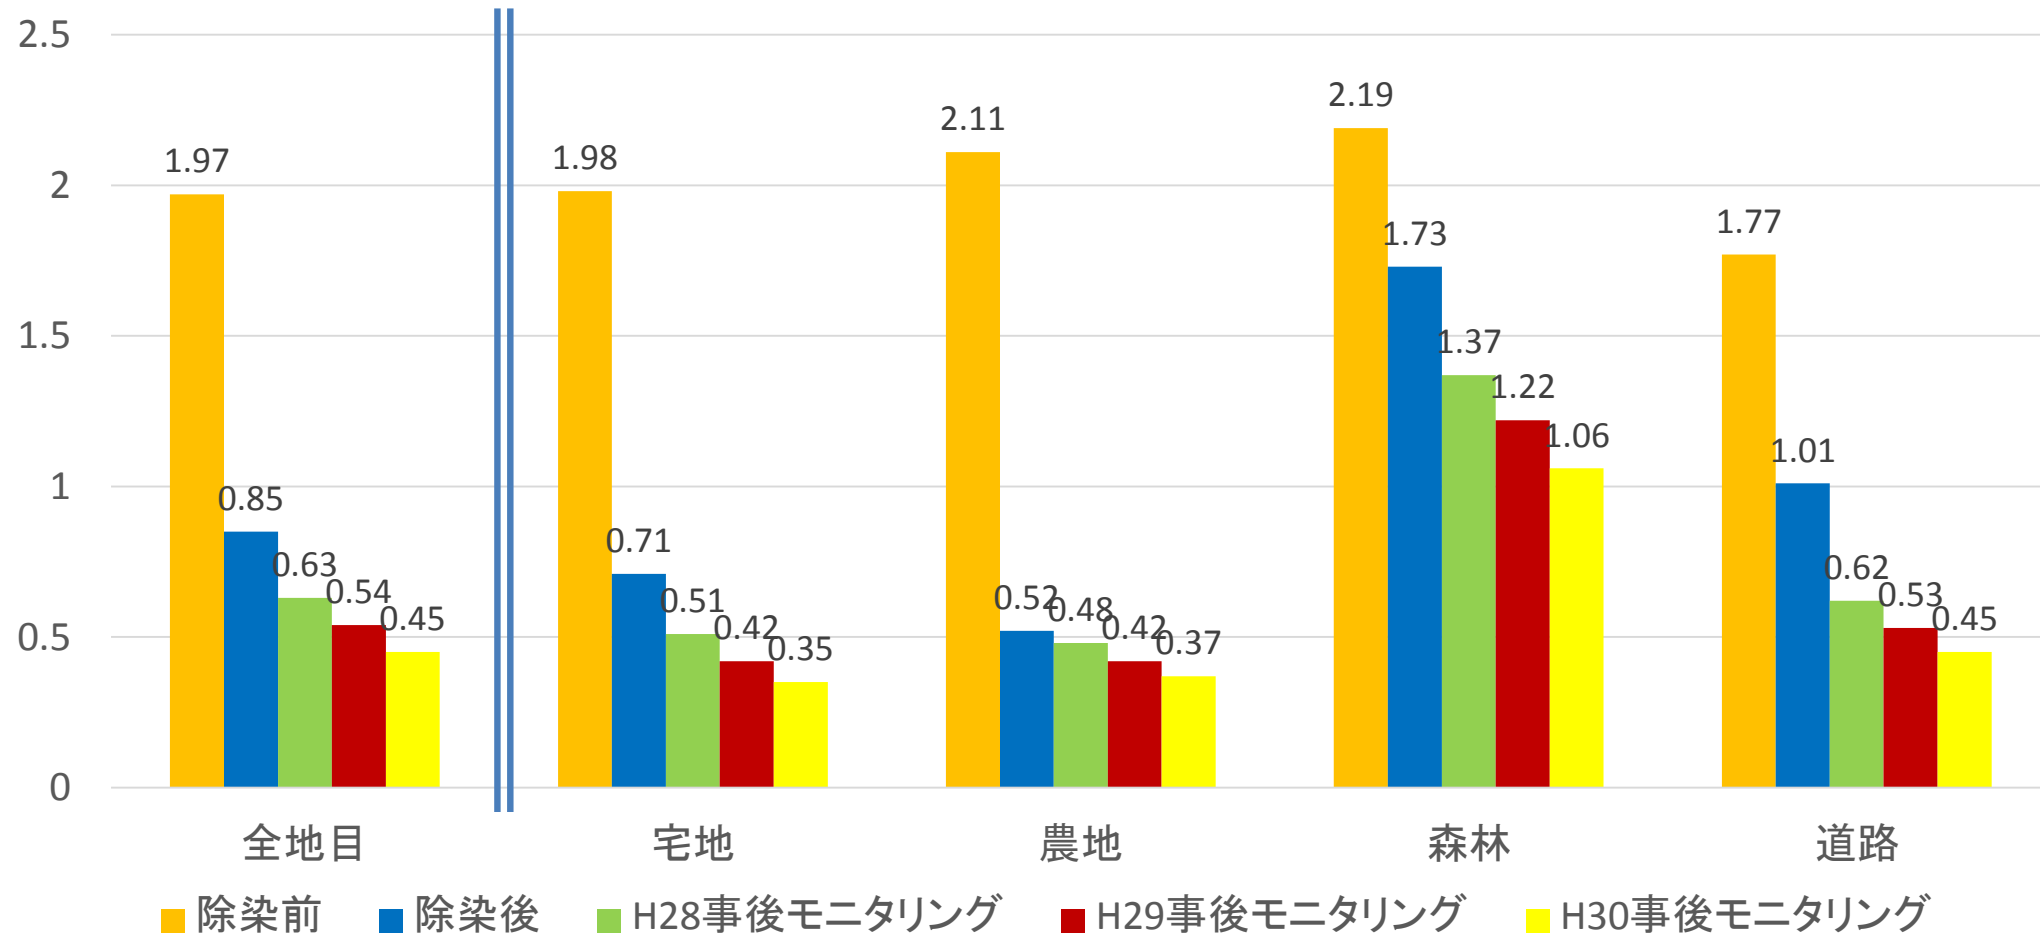

H30 事後モニタリング結果（1m）

3

【1m空間線量率・全地目】

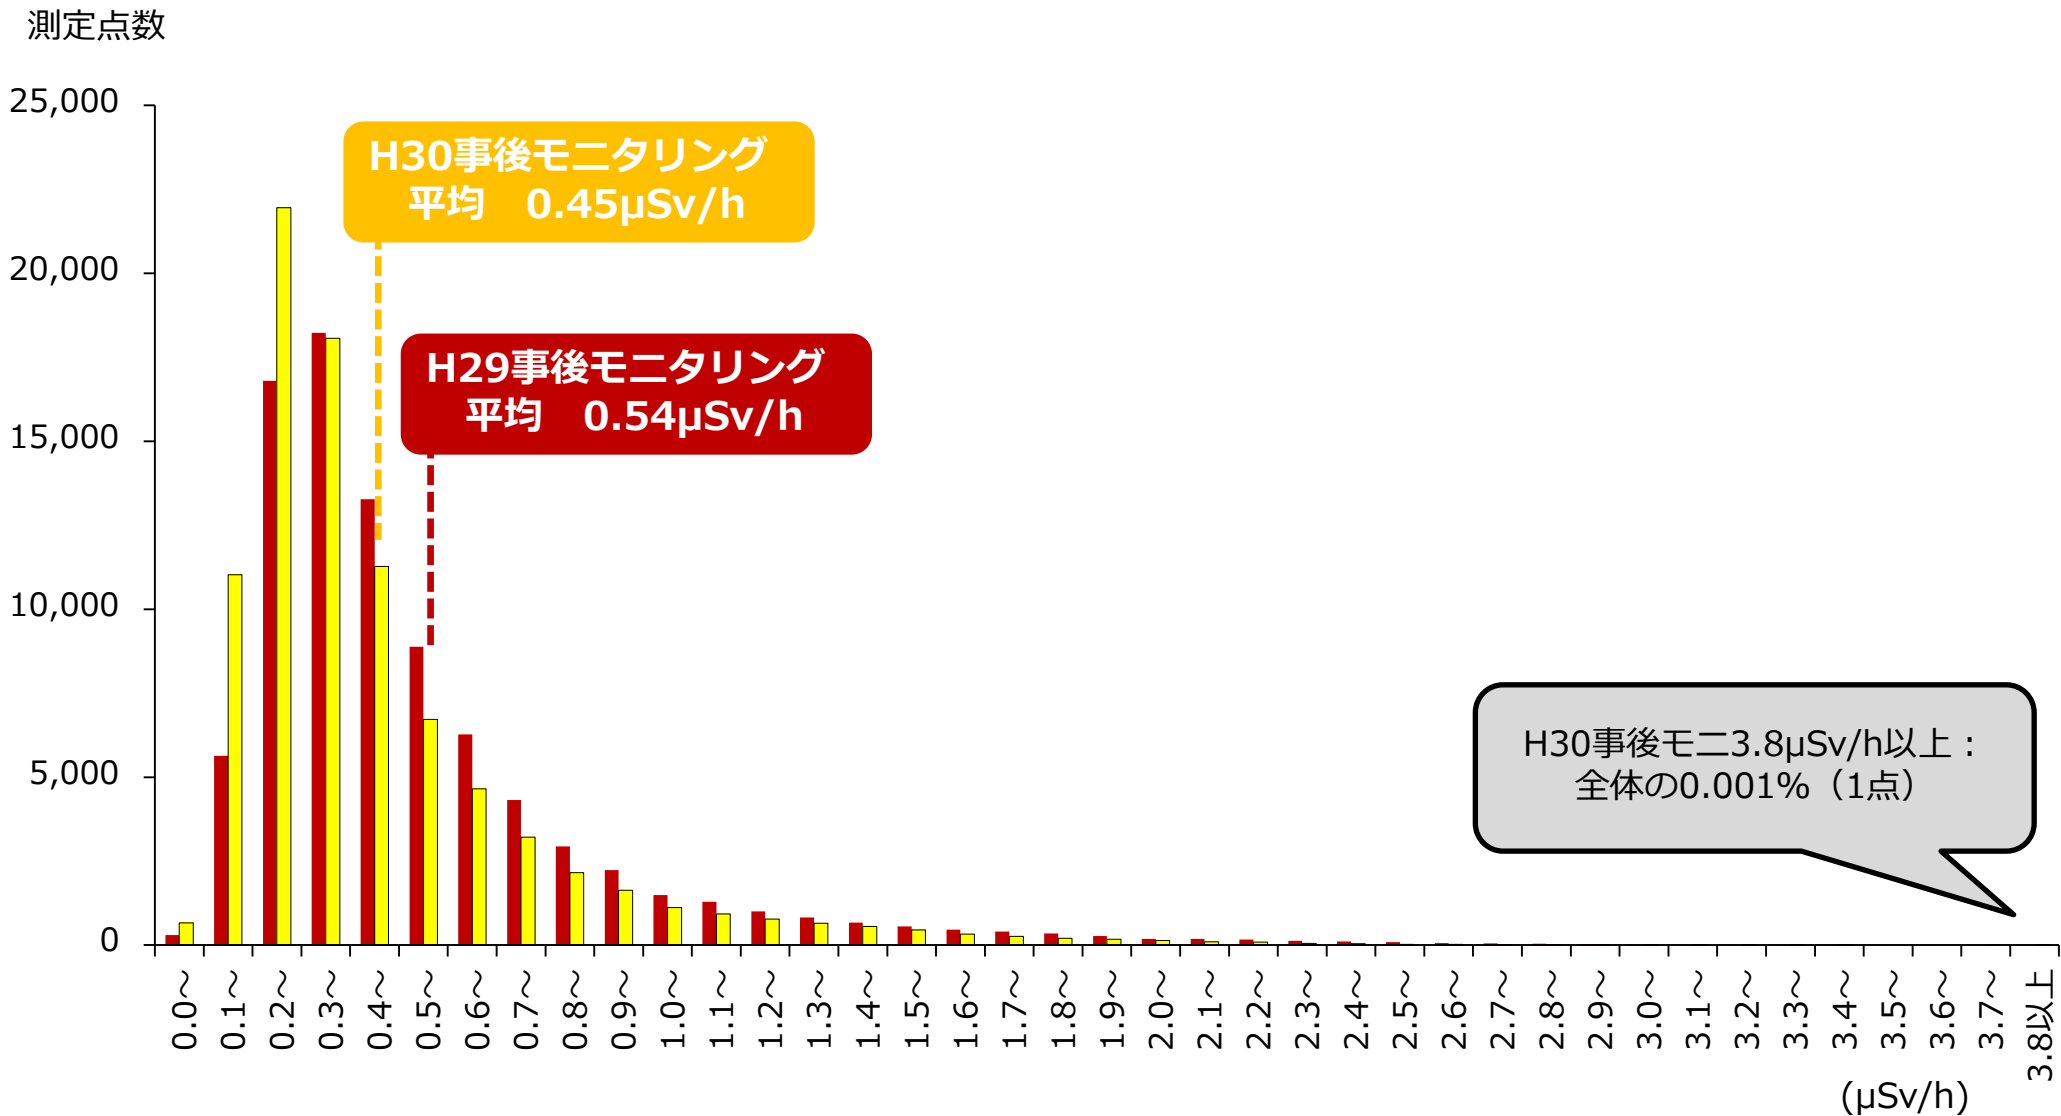


H30 事後モニタリング結果（1 cm）

4

30年度の事後モニタリング結果によると、宅地では1 cm空間線量率が
5.79 μ Sv/hから**0.42 μ Sv/h**に低減（低減率93%）しました。

【1 cm空間線量率】

(μ Sv/h)

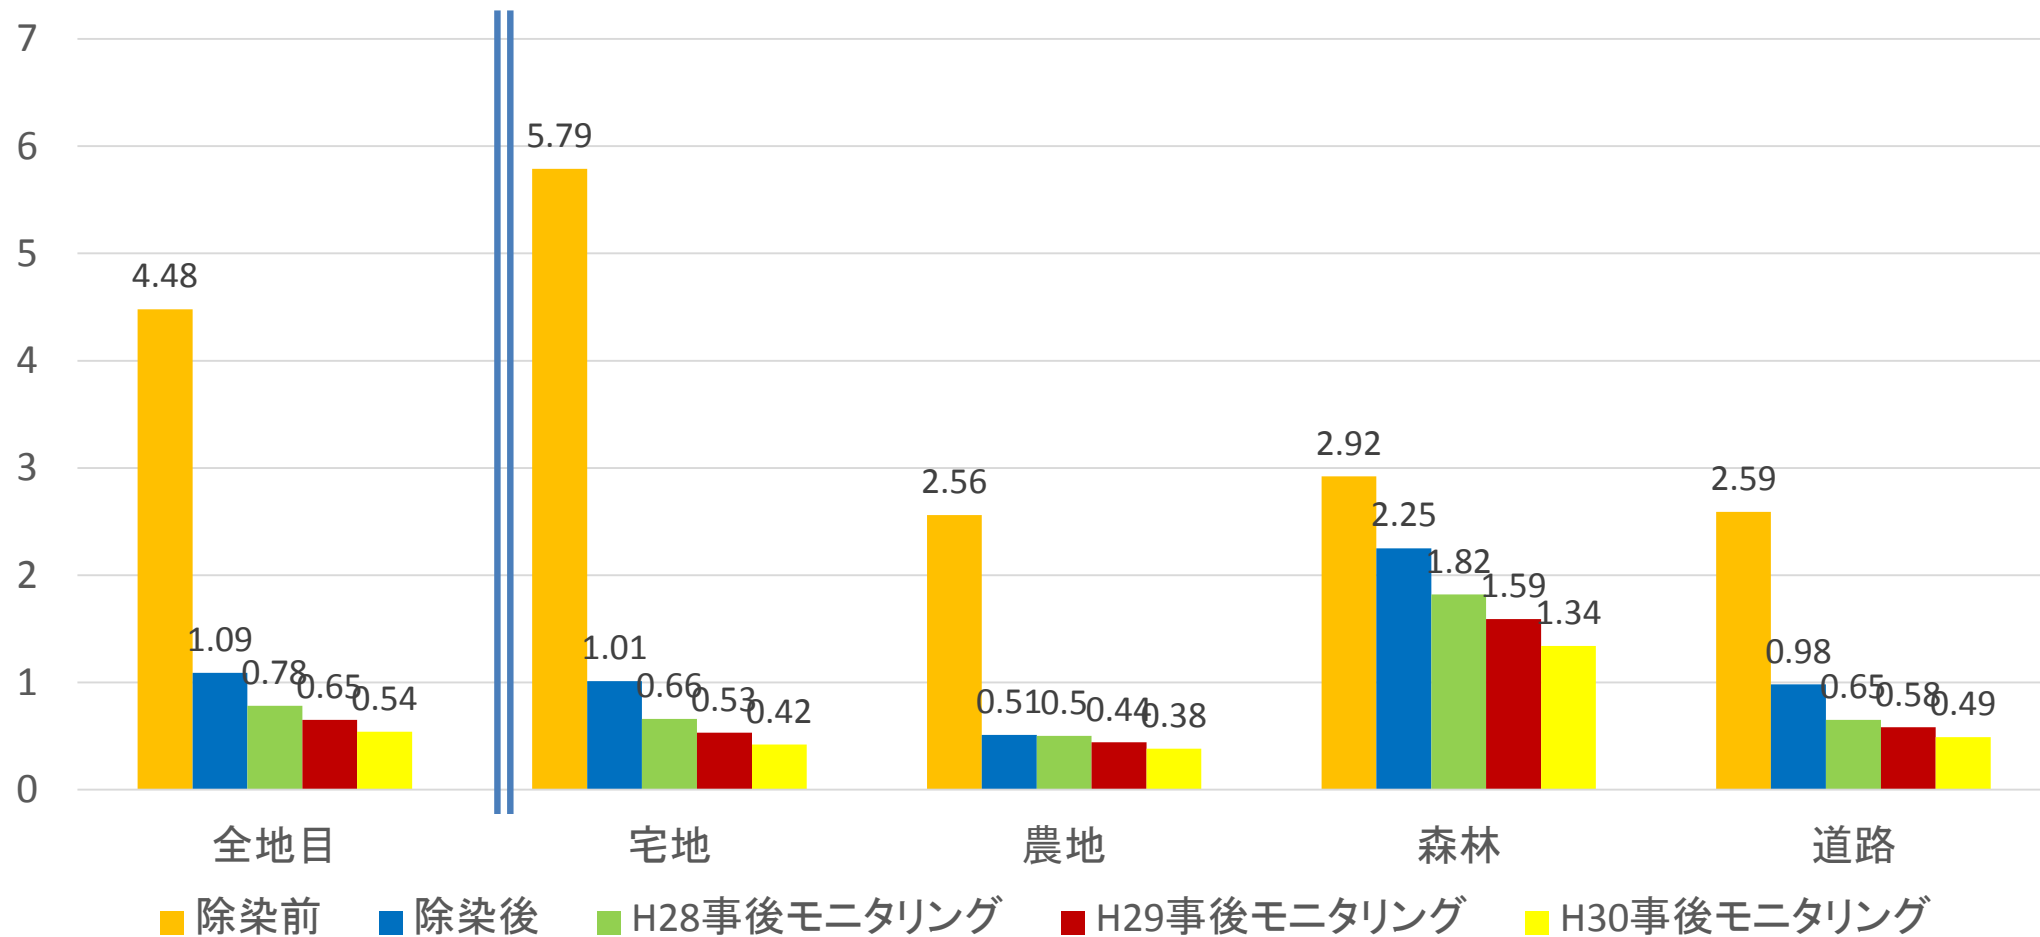



H30 事後モニタリング結果（1 cm）

5

【1 cm空間線量率・全地目】

測定点数

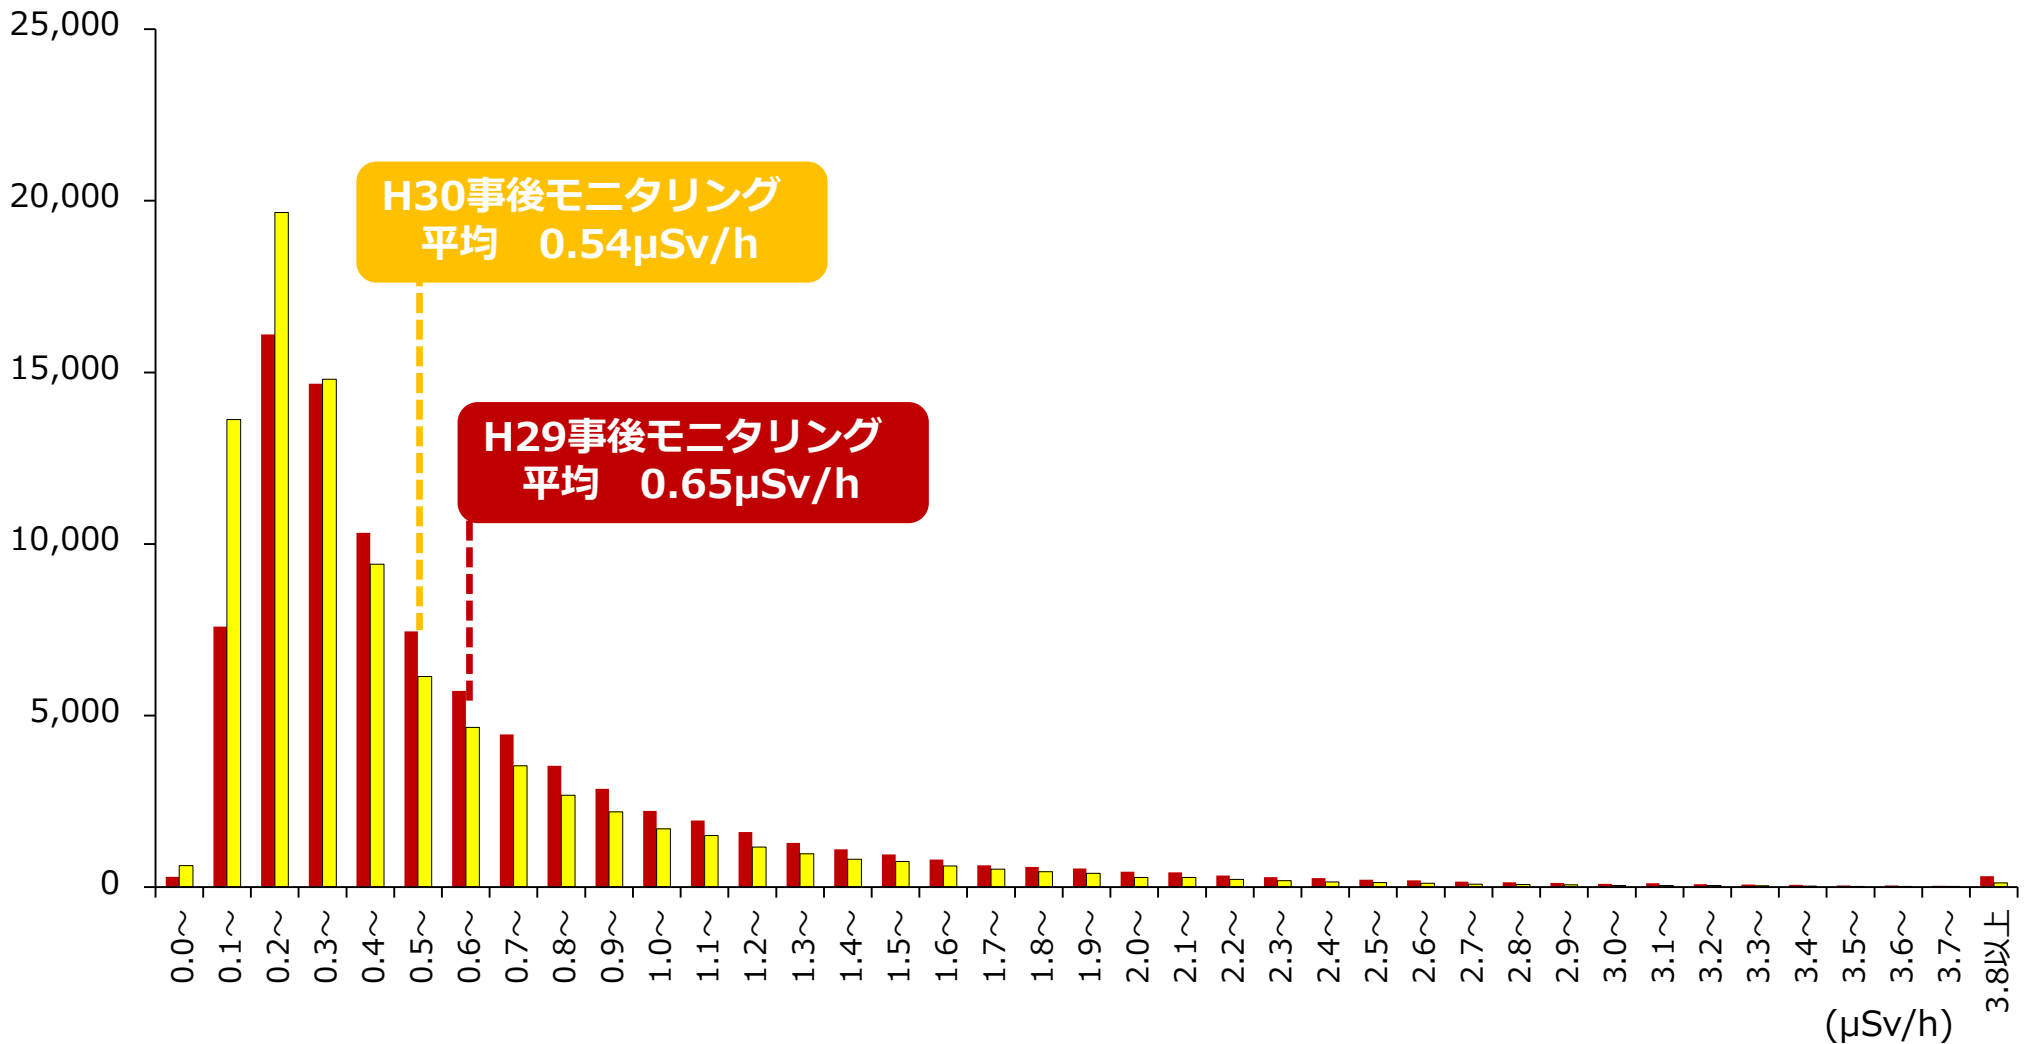

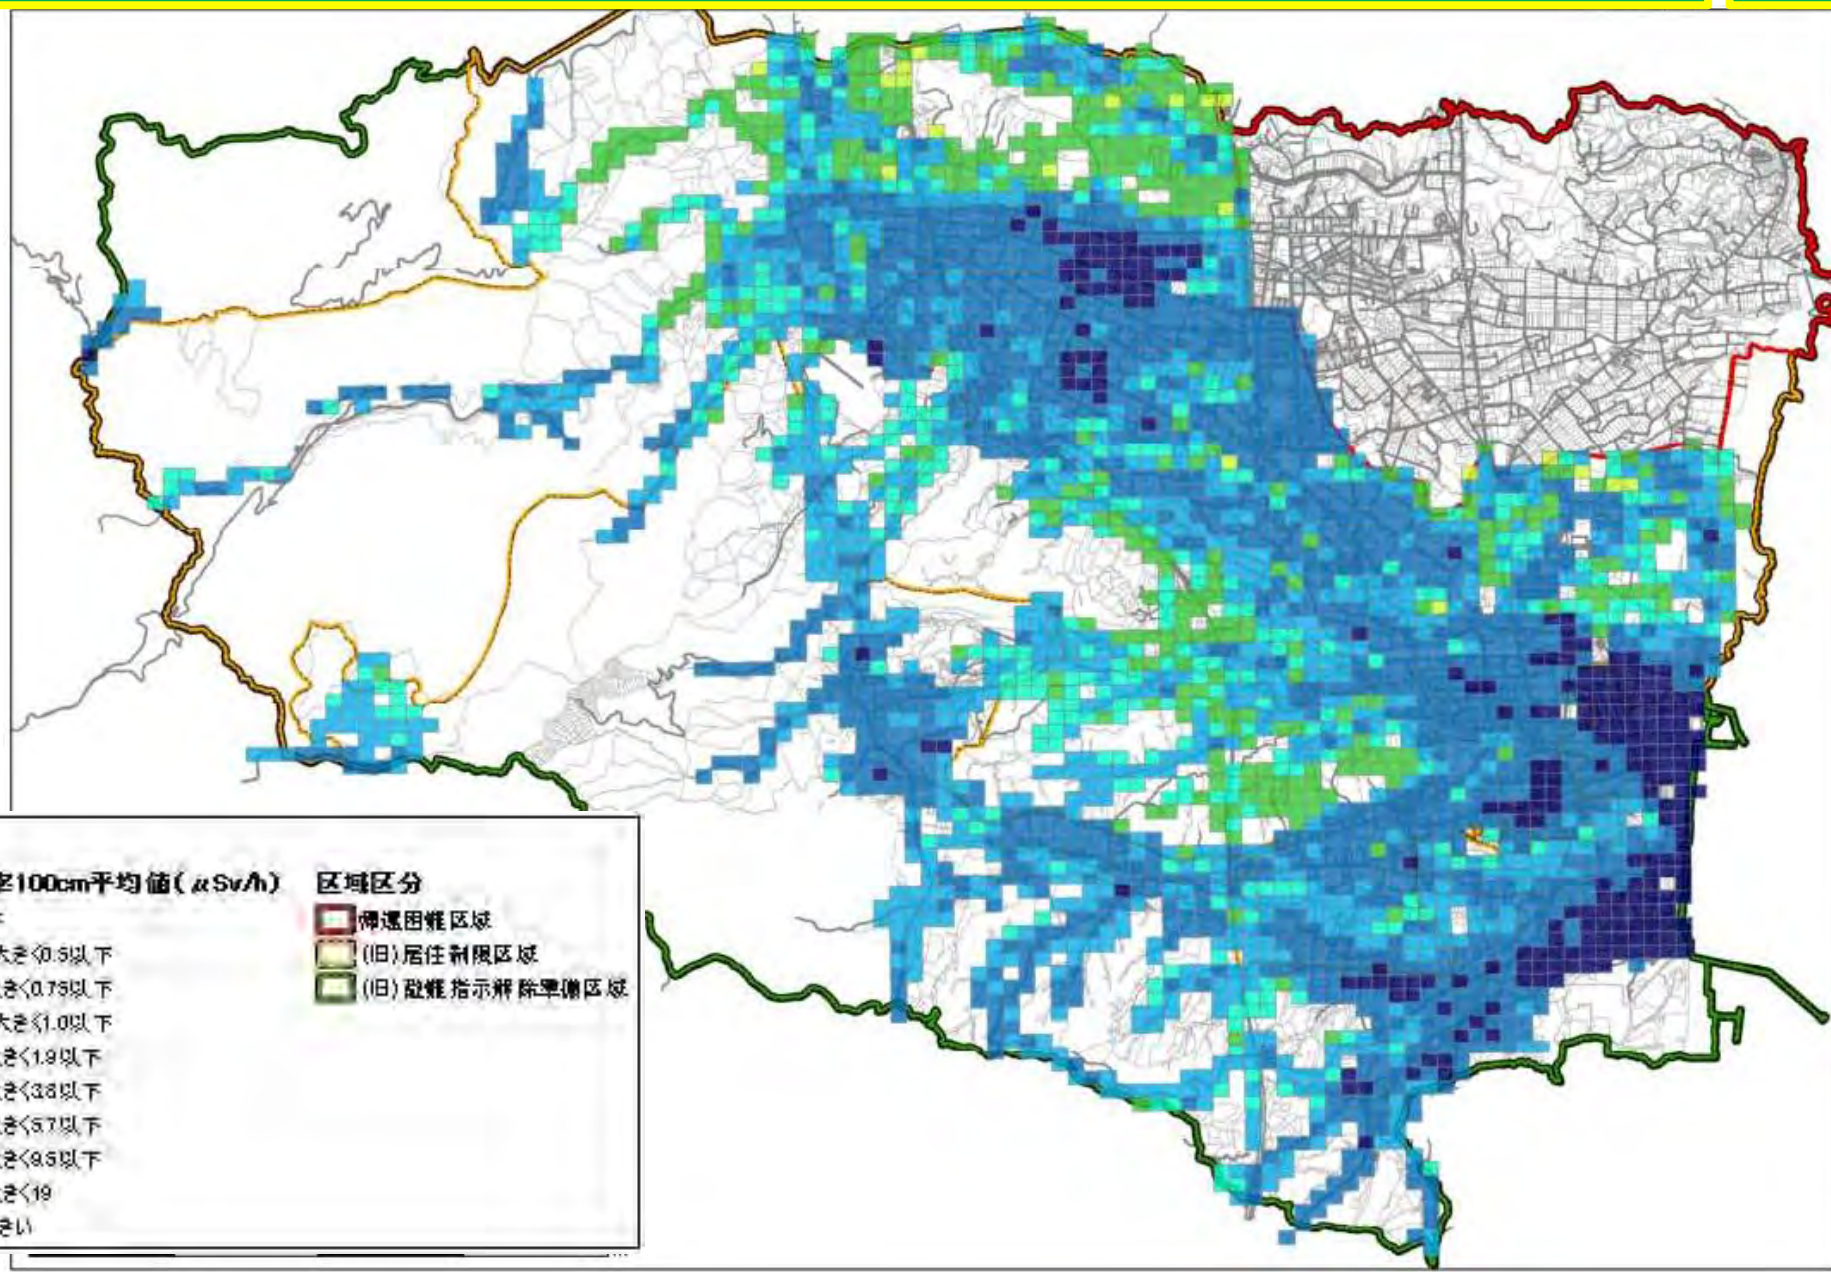

凡例


空間線量率100cm平均値(μSv/h)

- 0.23以下
- 0.23より大きく0.5以下
- 0.5より大きく0.75以下
- 0.75より大きく1.0以下
- 1.0より大きく1.9以下
- 1.9より大きく3.8以下
- 3.8より大きく5.7以下
- 5.7より大きく9.5以下
- 9.5より大きく19
- 19より大きい


区域区分

- 避難困難区域
- (旧)居住制限区域
- (旧)避難指示解除準備区域


除染前

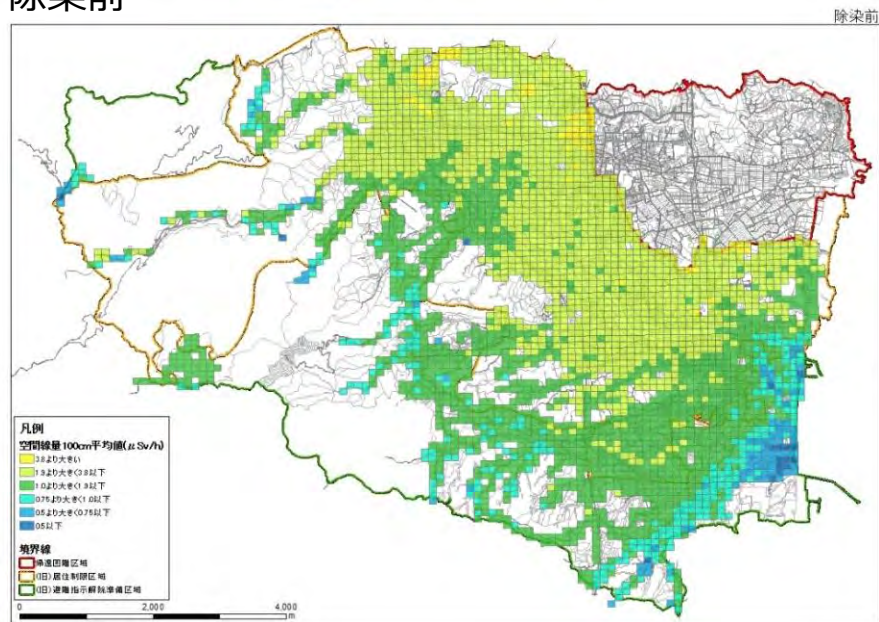


除染後

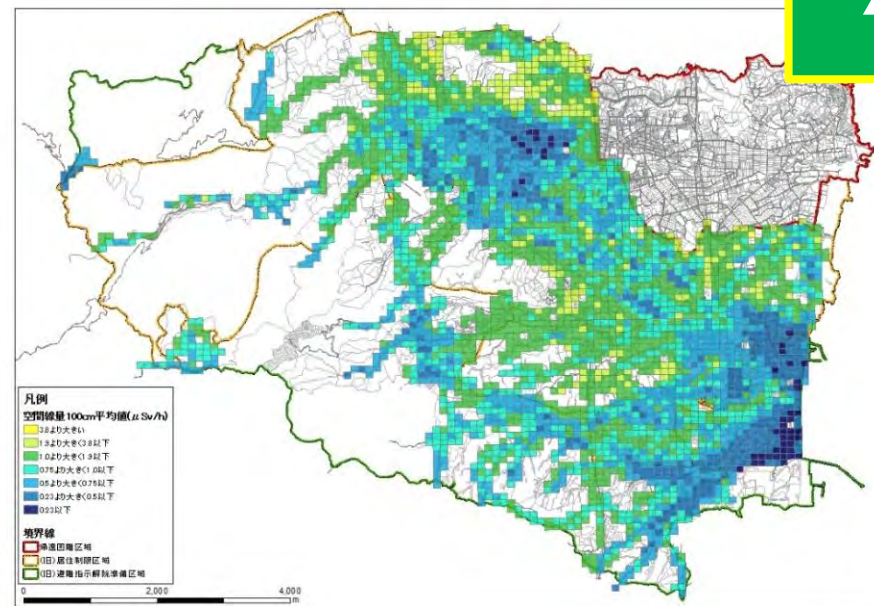

H28事後モニタリング

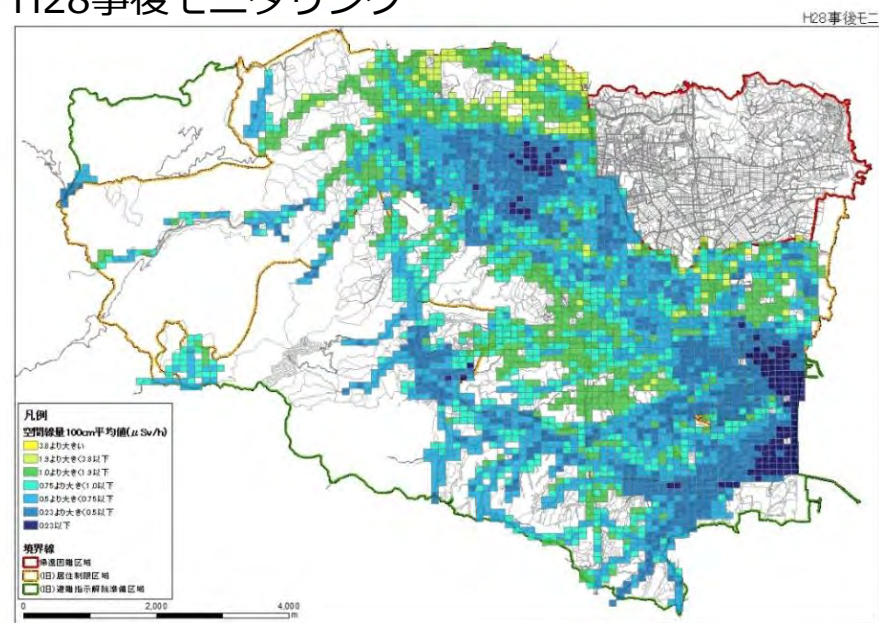

H29事後モニタリング

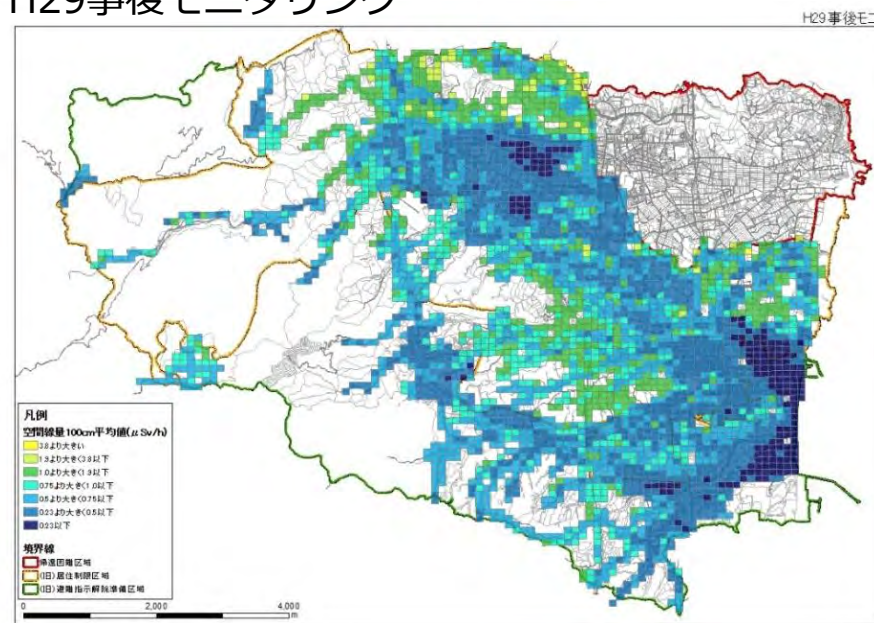


夜の森先行地区における除染について

夜の森（先行地区）の除染前後線量（1m）

8

夜の森（先行地区）について、宅地では1 m空間線量率が除染前**1.89 μ Sv/h**から除染後**0.73 μ Sv/h**に低減（低減率62%）しました。

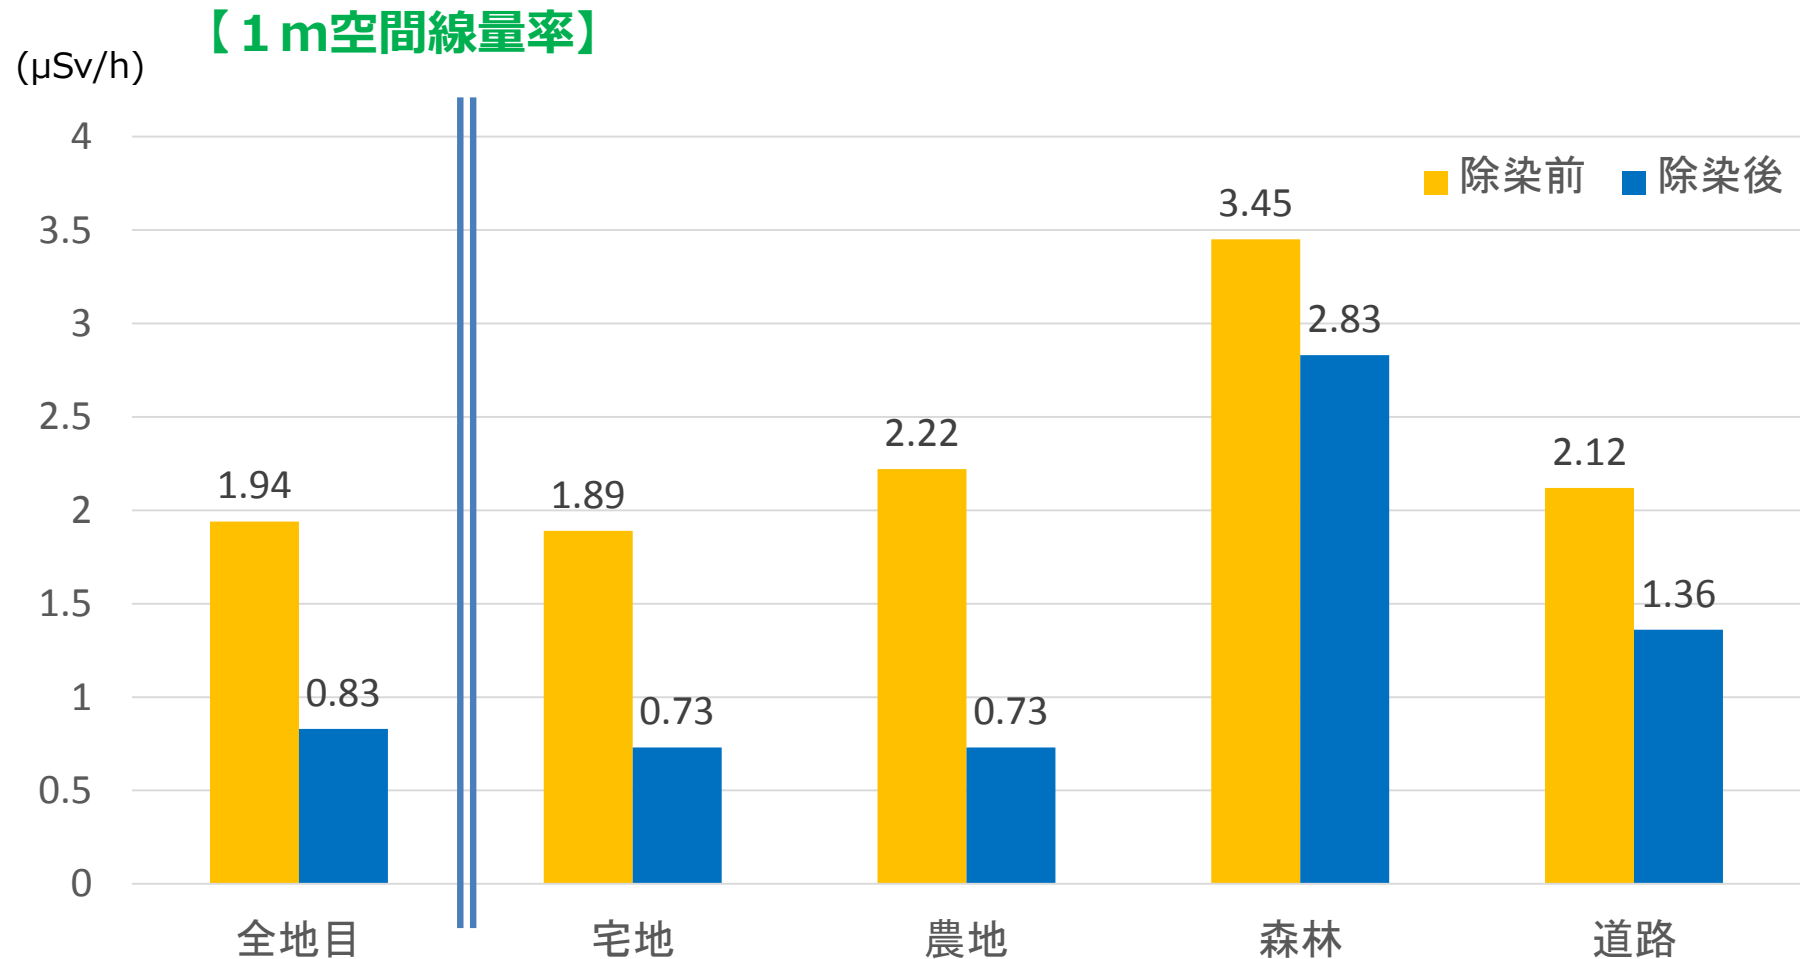


夜の森（先行地区）の除染前後線量（1m）

9

【1m空間線量率・全地目】


測定点数

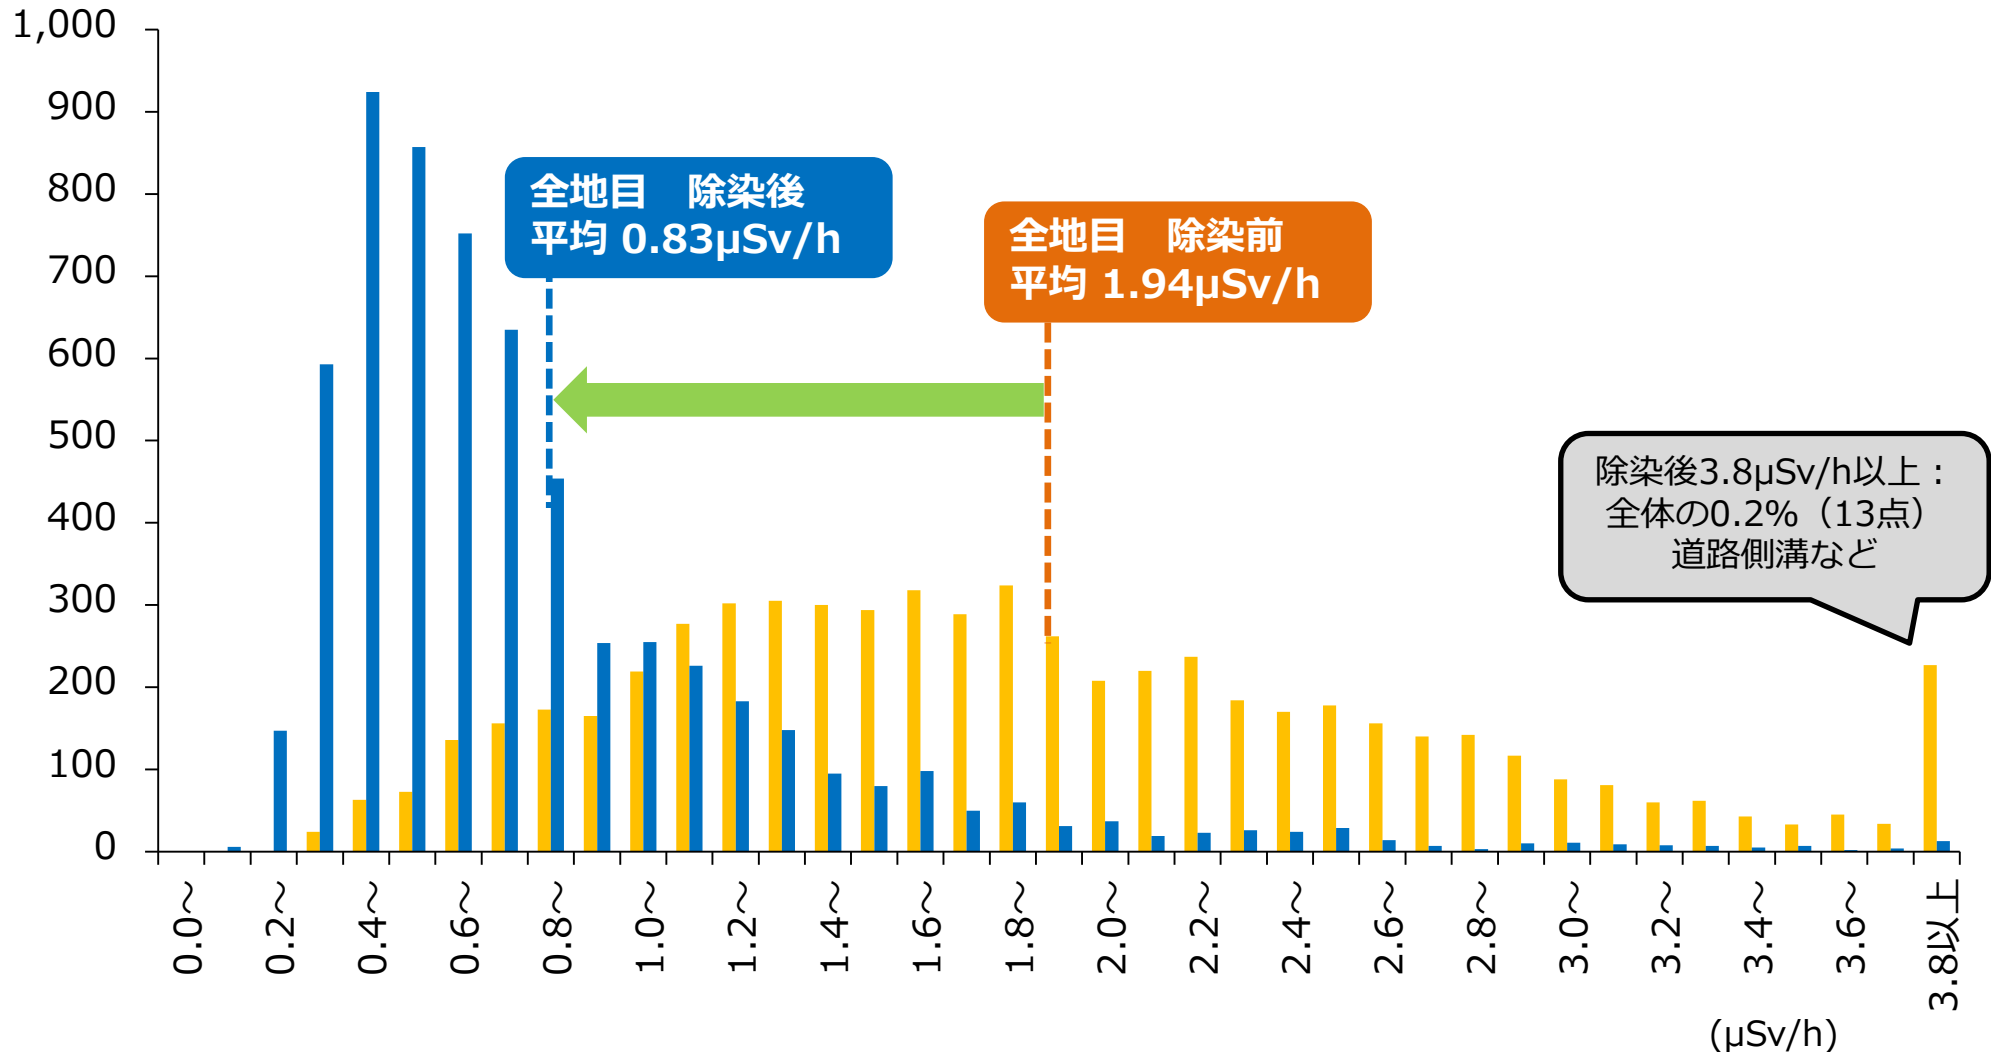

夜の森（先行地区）の除染前後線量（1 cm）

10

夜の森（先行地区）について、宅地では1 cm空間線量率が除染前**5.62 μ Sv/h**から除染後**1.01 μ Sv/h**に低減（低減率82%）しました。

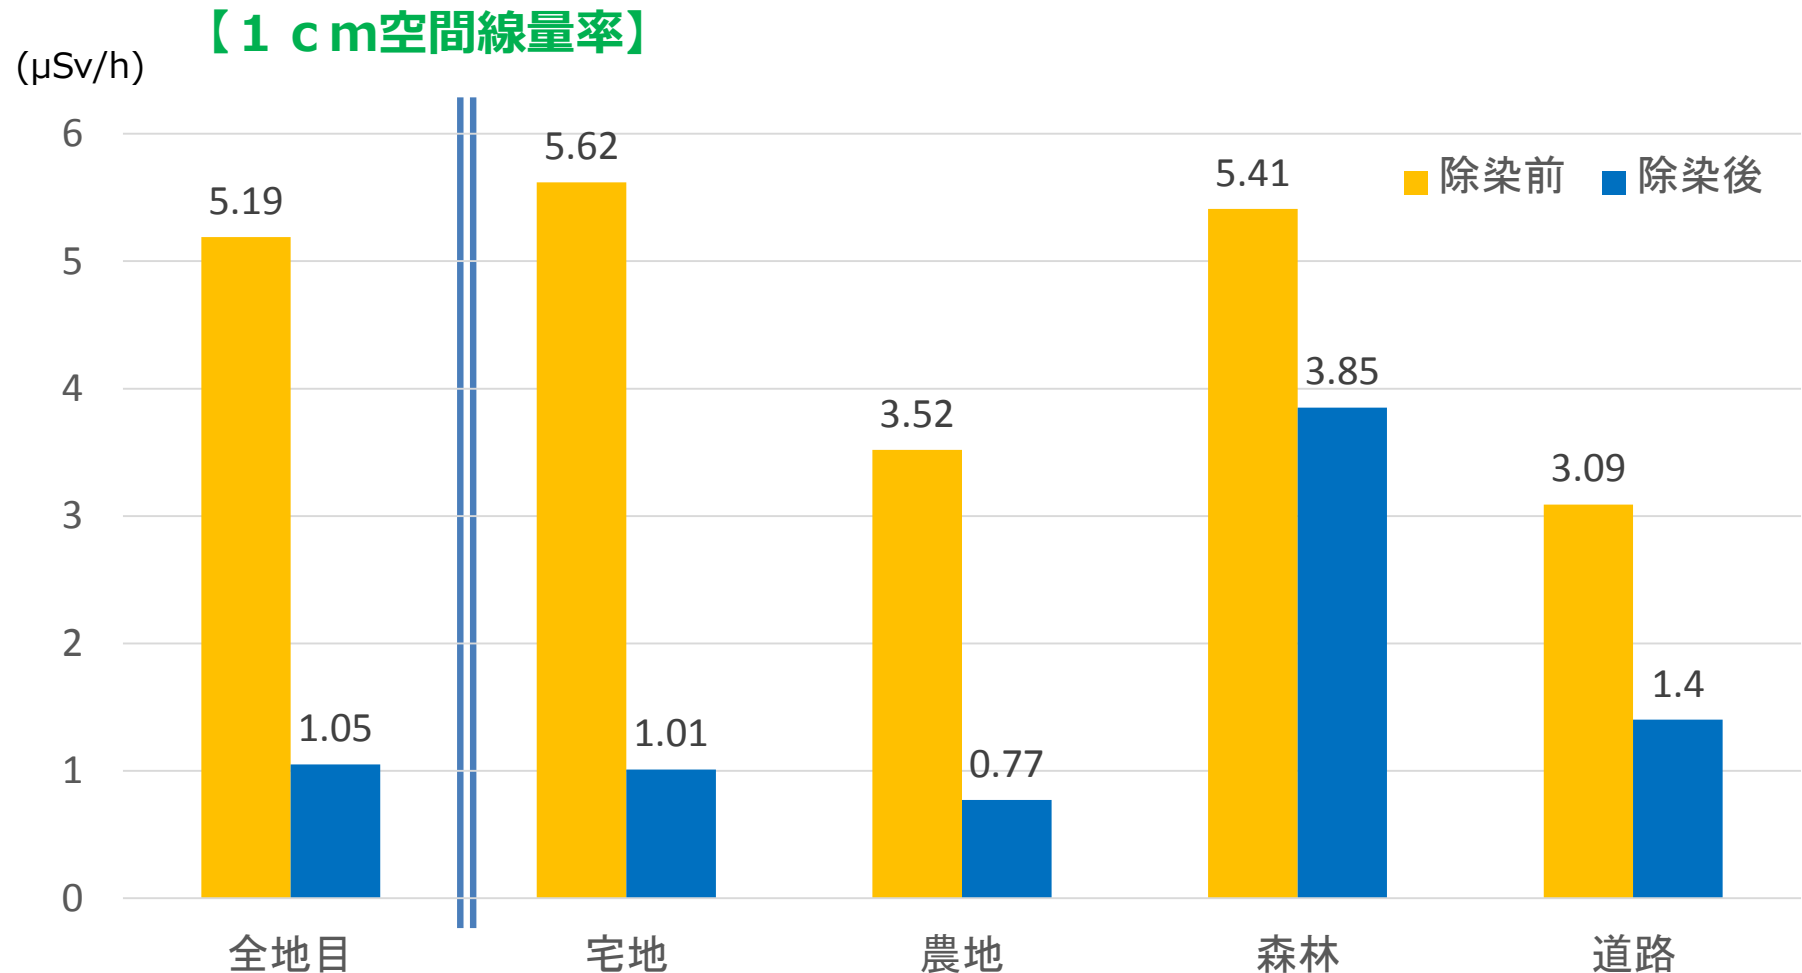


夜の森（先行地区）の除染前後線量（1 cm）

11

【1 cm空間線量率・全地目】

測定点数

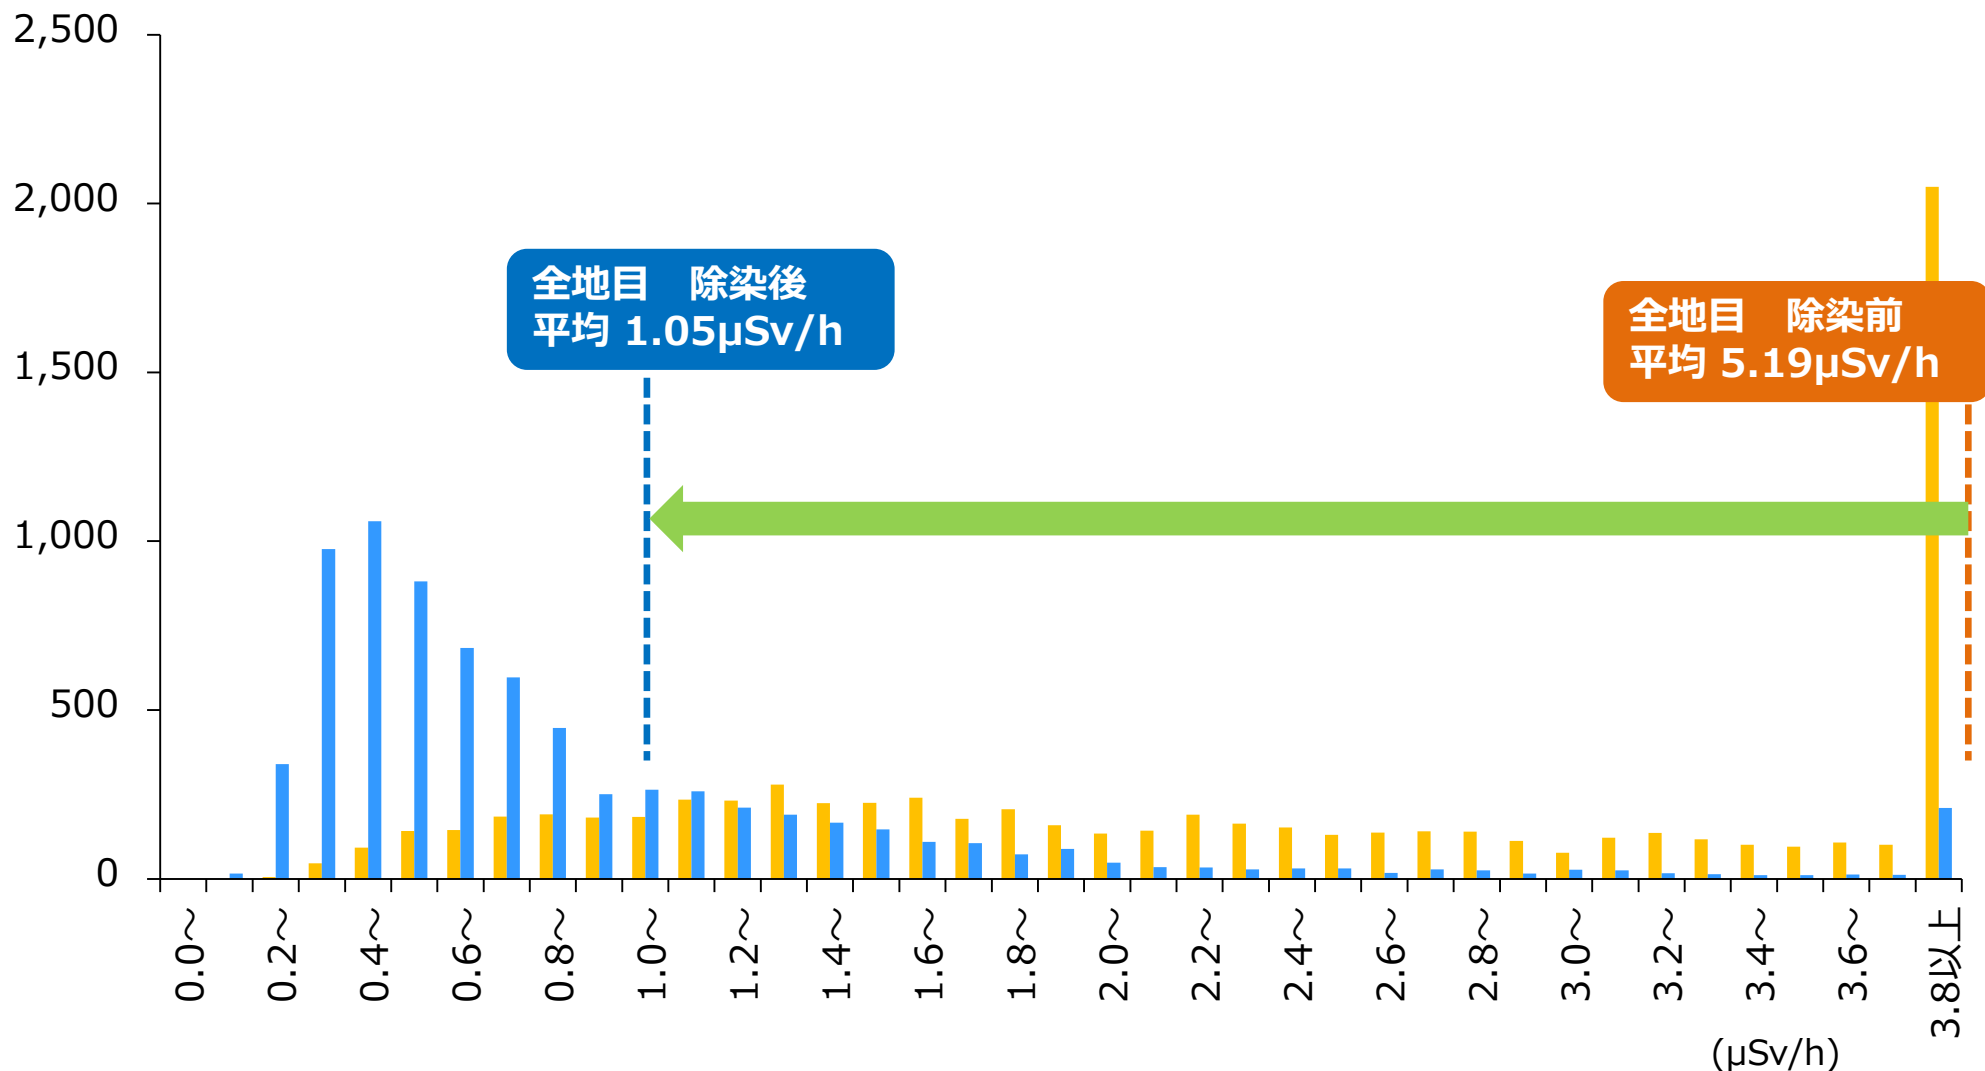


○帰還困難区域内の夜の森桜並木の除染実施時期



＜現在の状況＞


桜の木の根元周辺は堆積物除去のみ実施
(根の損傷を避けるため)

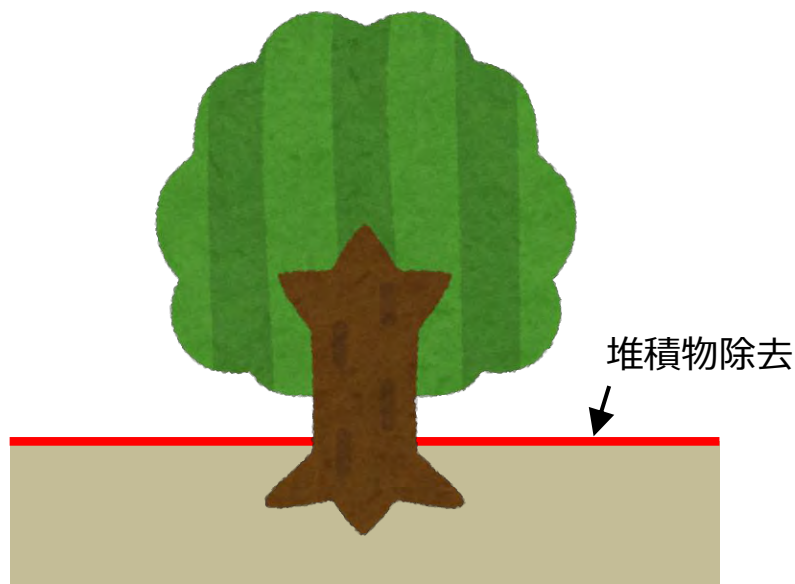

根元周辺に高線量の土が残され、
付近の空間線量に影響

＜追加的措置＞


根の張りを確認したうえで、桜の根元から離れた場所については表土剥ぎ取りを実施。
根元のすぐ側には2 c m程度の覆土を実施。

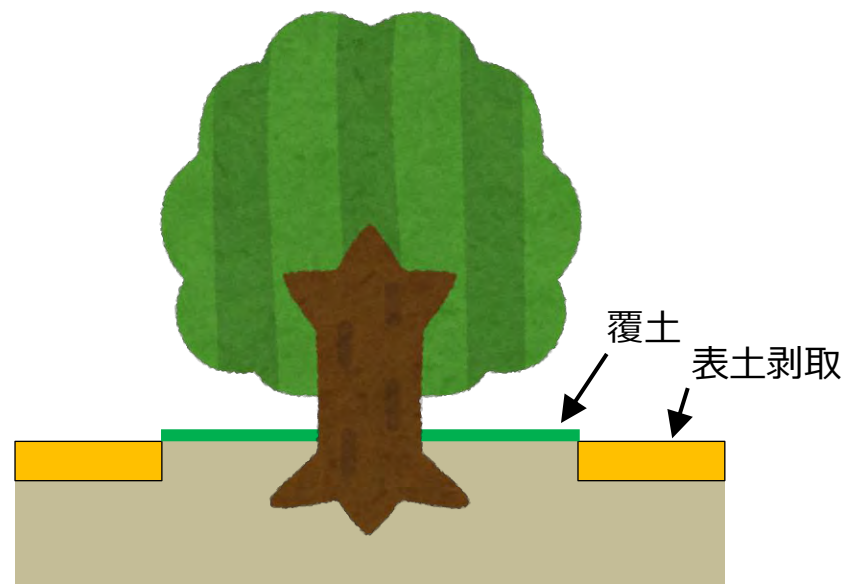

<参考>

走行モニタリング測定結果（平成30年12月。富岡町HP）

線量：0.18～0.81 μ Sv/h

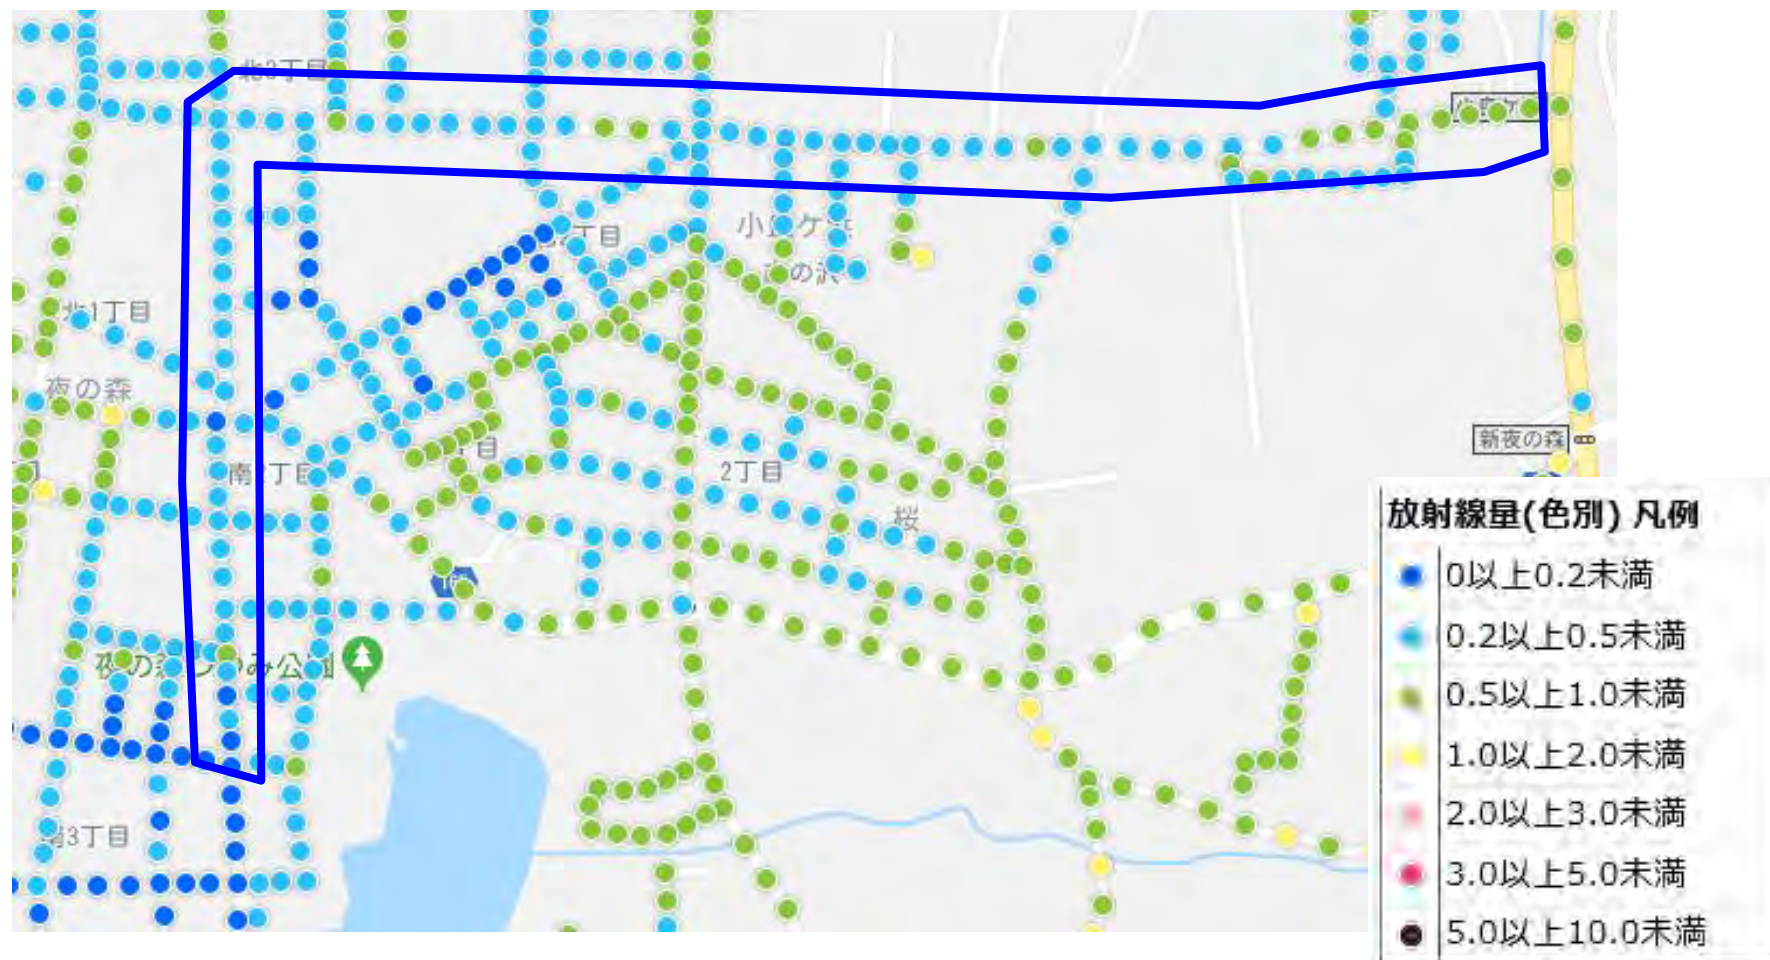

特定復興再生拠点区域における 除染解体について

○事前調査・同意取得業務、建物解体申請受付

- ・ A地区：同意取得率…82%
- ・ BC地区：事前調査及び同意取得業務の実施準備中
- ・ 建物解体申請：273件受付済（ABC地区合計。夜の森先行区域除く）

○除染・建物解体工事


- ・ 除染：公道、夜の森つつみ公園、新田団地、その他約70画地について除染実施中もしくは実施済。（A地区公道：55%除染完了）
- ・ 解体：三者立会済126件、現場着手35件



拠点の除染/建物解体の今後のスケジュール

16

状況に応じ計画は変更する可能性があります

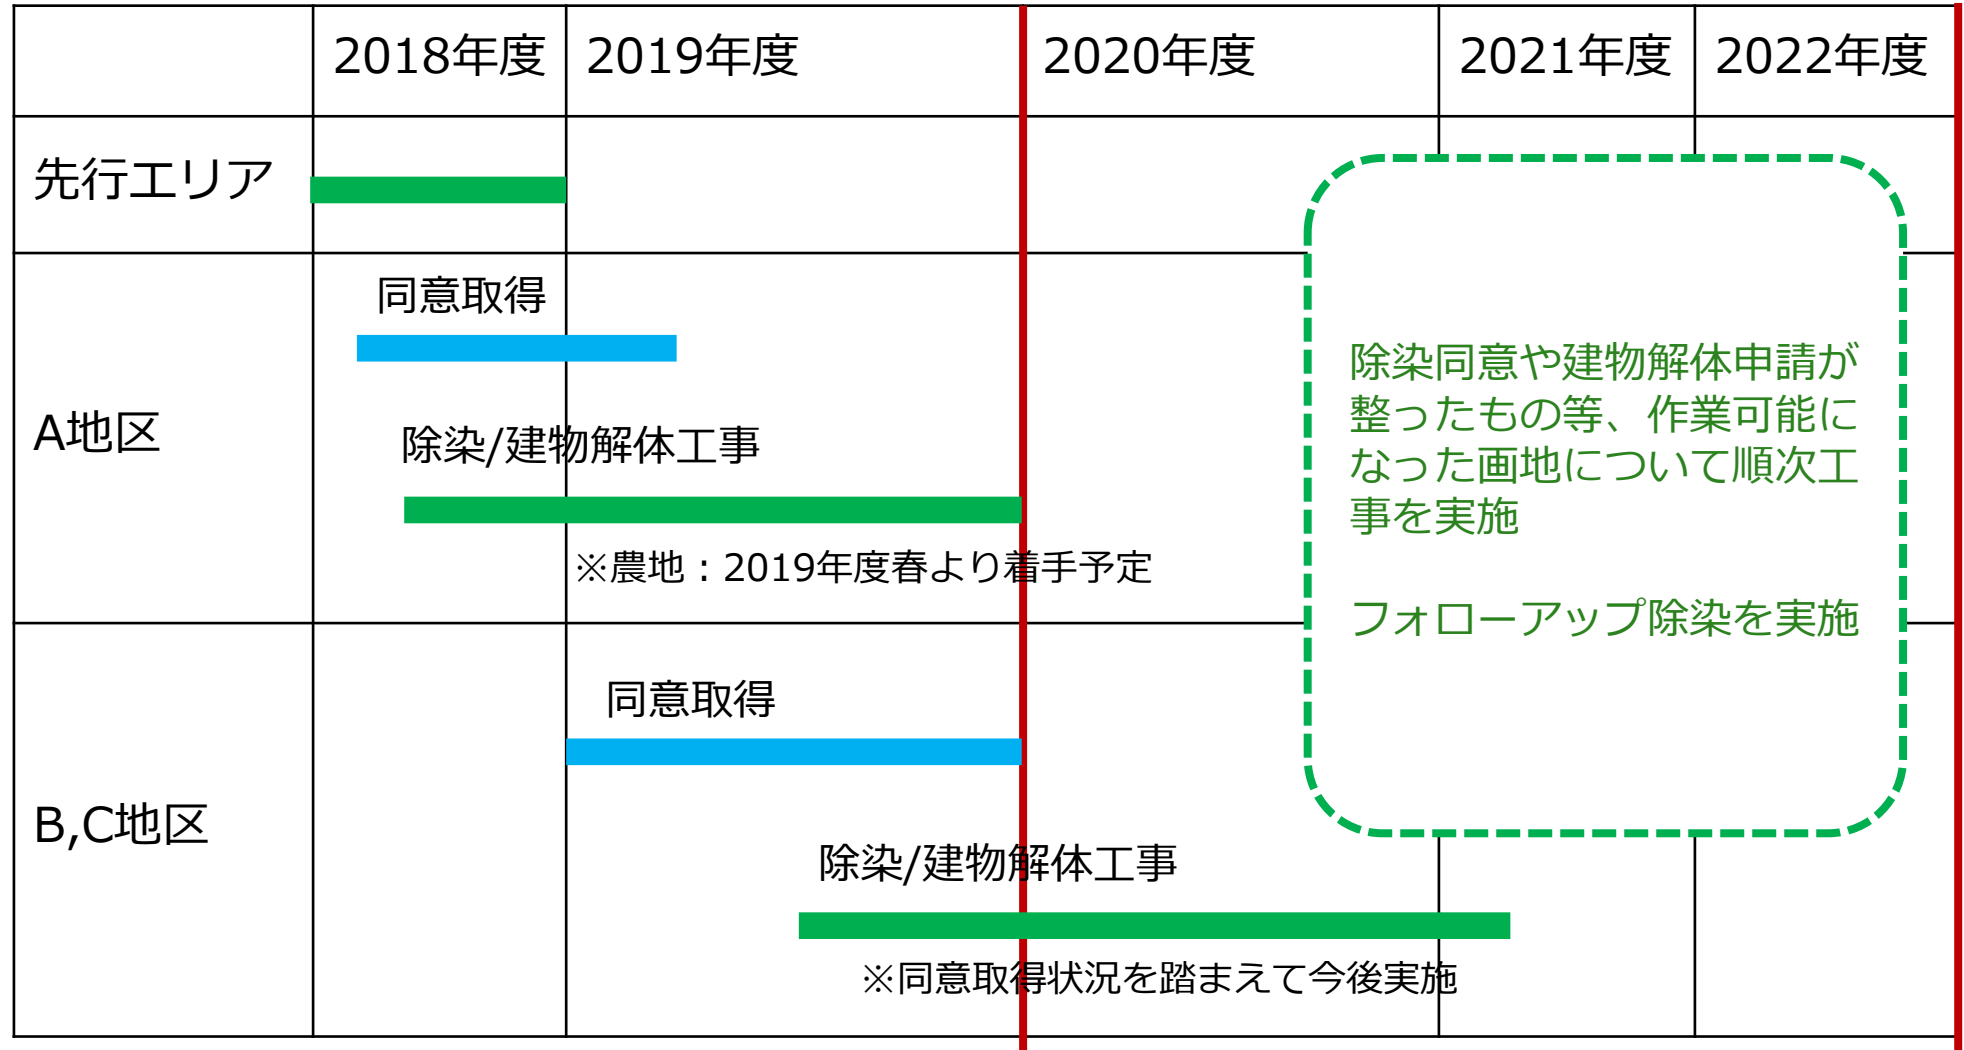

2019年度末頃：夜ノ森
駅周辺の避難指示解除

2023年春頃：
避難指示解除

