

特定復興再生拠点区域（点・線拠点） の空間線量の状況について

令和5年9月28日 環境省 福島地方環境事務所






本資料の構成

○特定復興再生拠点区域（点・線拠点）の空間線量率について

（参考）特定復興再生拠点区域（点・線拠点）
の除染等の進捗状況等について




特定復興再生拠点区域（点・線拠点） の空間線量率について

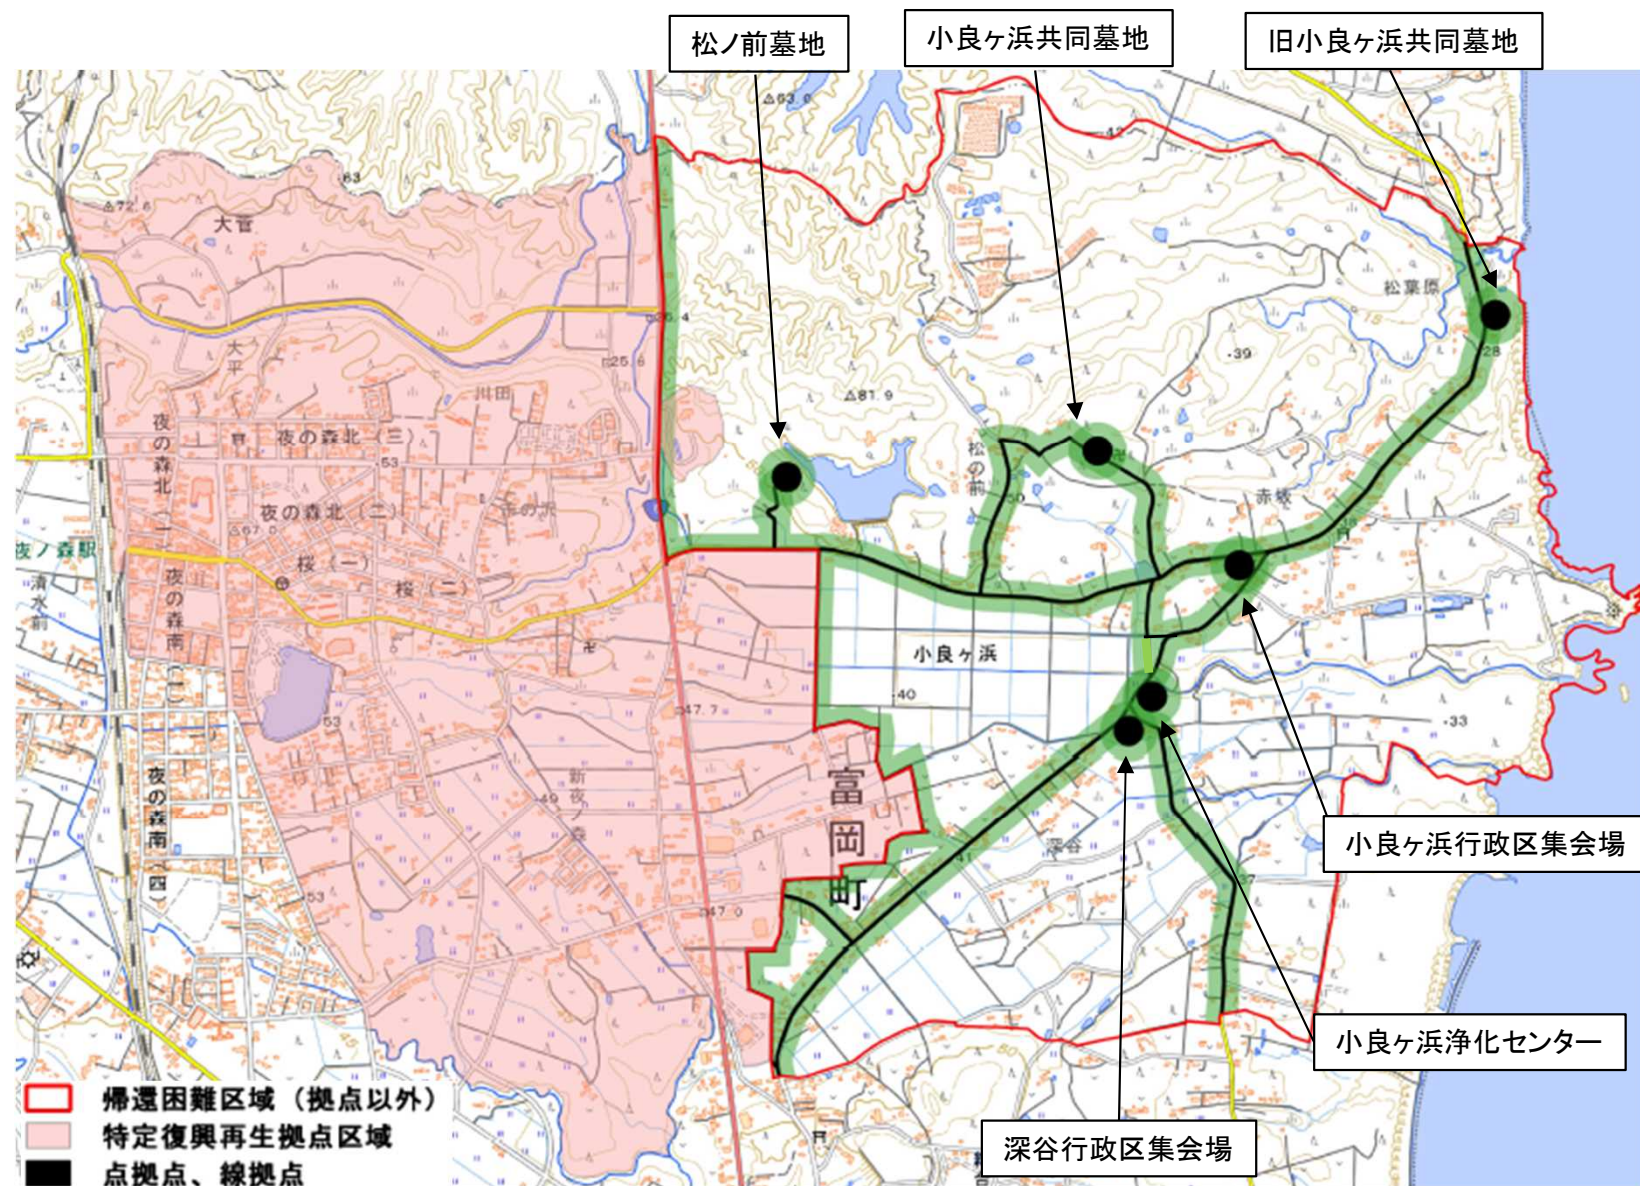

外縁除染範囲
(仮置場除く)

原則として特定復興再生拠点から、宅地・農地は20m範囲内にある一筆を除染、森林・道路は最大20mの範囲を除染。

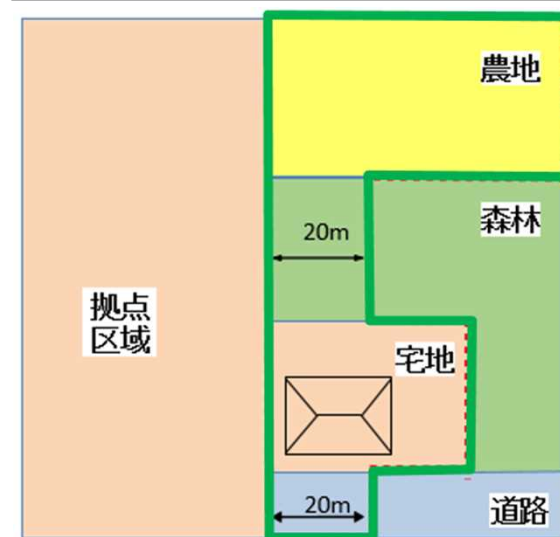

特定復興再生拠点区域における空間線量率について

～線拠点～

<線拠点の除染状況>

○除染済／実線で明示

→ 平成27年(2015)3月までに完了

- ・①町道2004線、②町道1007線／水色
- ・県道391号線(県道広野小高線)／黄色
- ・県道251号線(県道小良ヶ浜野上線)／緑色
- ・松の前墓地へのアクセス路／白色


○除染作業中／破線で明示

- ①町道3090線、②町道3091線／赤色

→ 令和5年11月末までに完了予定

※路面(未舗装)は除染完了。

※路面(舗装)及び路肩は今後実施予定。

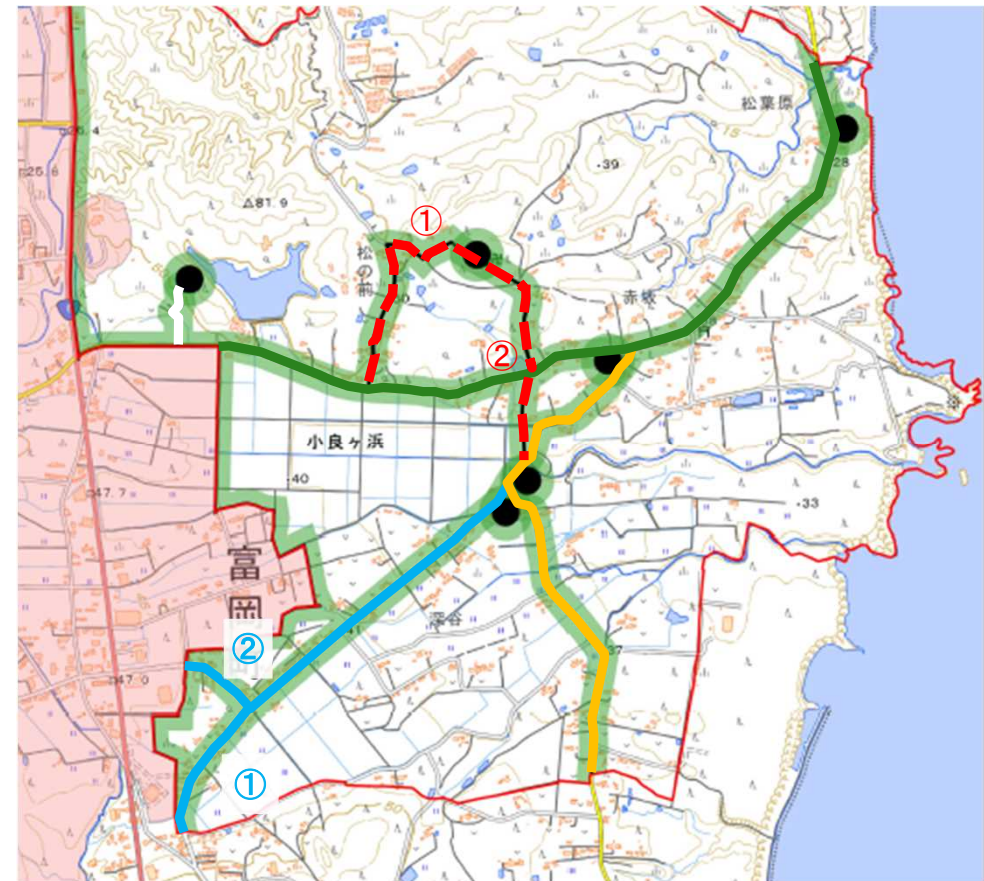

<線拠点の平均空間線量率の変化>

R4.9.26	R5.9.11,9.14	低減率
0.89 $\mu\text{Sv/h}$ (最大値: 3.50 $\mu\text{Sv/h}$) (最小値: 0.22 $\mu\text{Sv/h}$)	0.87 $\mu\text{Sv/h}$ (最大値: 2.45 $\mu\text{Sv/h}$) (最小値: 0.18 $\mu\text{Sv/h}$)	2.2%


特定復興再生拠点区域における空間線量率及び対応予定 ～点拠点①～



<点拠点の平均空間線量率の変化>

	R5.7.10	R5.7.10
松の前共同墓地	1.30 μ Sv/h	終了次第、報告 μ Sv/h
旧小良ヶ浜共同墓地	1.60 μ Sv/h	終了次第、報告 μ Sv/h

特定復興再生拠点区域における空間線量率及び対応予定 ～点拠点②～

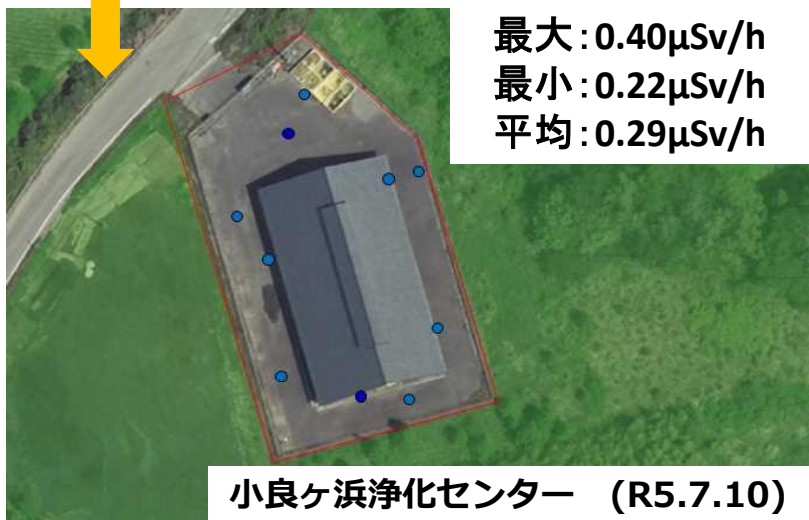

< 点拠点の平均空間線量率の変化 >

小良ヶ浜共同墓地	1.20 μ Sv/h (R5.7.10)	終了次第、報告
小良ヶ浜浄化センター	0.29 μ Sv/h (R4.6.17)	0.29 μ Sv/h (R5.7.10)

特定復興再生拠点区域における空間線量率及び対応予定 ～点拠点③～

最大: 2.25 μ Sv/h
最小: 0.93 μ Sv/h
平均: 1.62 μ Sv/h



小良ヶ浜行政区集会所
(R5.8.23)

最大: 1.17 μ Sv/h
最小: 0.42 μ Sv/h
平均: 0.76 μ Sv/h



小良ヶ浜行政区集会所
(R5.9.22)

最大: 1.84 μ Sv/h
最小: 0.95 μ Sv/h
平均: 1.44 μ Sv/h




深谷行政区集会所
(R5.9.12)

最大: 0.77 μ Sv/h
最小: 0.25 μ Sv/h
平均: 0.47 μ Sv/h



深谷行政区集会所
(R5.9.22)



< 点拠点の平均空間線量率の変化 >

	除染前	除染後
小良ヶ浜行政区集会所	1.62 μ Sv/h	0.76 μ Sv/h
深谷行政区集会所	1.44 μ Sv/h	0.47 μ Sv/h

- 解体（令和5年8月末日時点）
解体申請数95件、解体完了56件、着工中 9 件
なお、「解体完了」件数は上屋解体が完了した数
- 除染（令和5年8月末日時点）
 - ◆避難指示解除済区域（フォローアップ除染等）
 - ・町による線量率測定結果等を踏まえて、個別のホットスポット解消に向けて取り組んでいるところ
 - ◆特定復興再生拠点区域除染工事進捗状況（令和5年8月末日時点）

地目	除染対象面積 ()内は未同意 画地 (内数)	除染済み面積	除染進捗率	着手済み面積	見込除染 進捗率
	a	b	b/a	C	(b+c)/a
宅地	20.7ha (2.0ha)	4.0ha	19.4%	10 ha	68 %
農地	15.7ha (1.8ha)	6.2ha	39.2%	4 ha	65 %
森林	6.6ha (0.6ha)	2.7ha	40.3%	1 ha	55 %
道路	0.4ha (0.1ha)	0.0ha	0.0%	0 ha	0 %
	※ 線 拠 点 に つ い て は 、 一 部 を 除 き お お む ね 完 了 。				
全体	43.4ha (4.5ha)	12.9ha	29.7%	15 ha	64 %
除染可能 範囲	38.9ha	—	—	—	72 %

＜拠点外縁＞

9月25日時点

地区	対象	同意	取得率
	人	人	%
線外縁	244	218	89.3

- ・ 未同意（26名、4.5ha）の主な理由
 - ・ 連絡先不明（7名）：町と共有し、連絡先を調査中
 - ・ 意向確認書送付・回答待ち（16名）
 - ・ 除染未同意・解体申請中（2名）
 - ・ 除染拒否（1名）
 - ・ 除染解体検討中（1名）
